



Broj: 01 _____
Datum: _____, 2019. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), člana 23. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/19), Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 2/17), Odluke o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13), Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 2/19) i Programa rada vijeća Tešanj za 2020. godinu, podnosim;

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu


U pregledu izvještaja Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu nalazi se dio koji se odnosi na projekte usvojene Odlukom za 2019. godinu.

Dana 14.03.2019.godine u 15.30 sati općinski Načelnik sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica. Tema sastanka je bila usvojeni Plan kapitalnih investicija za 2019.godinu i upoznavanje predstavnika mjesnih zajednica sa menadžerima projekata i dogovori vezani za dinamiku implementacije istih. Ukupno 45 projekata je bilo u Planu kapitalnih investicija za 2019. godinu, međutim u nekoliko mjesnih zajednica došlo je do izmjene prioriteta na prijedlog organa MZ, pa je broj projekata povećan u istom finansijskom okviru.

Od ukupnog broja planiranih projekata nekoliko projekata nije okončano. Projekti vodosnabdijevanja su ugovoreni krajem godine, jer se čekalo na formiranje vlade ZDK i donošenje Programom utroška vodnih naknada, ali su u toku 2019. godine procedure nabavke okončane i ugovori su potpisani u decembru, te je njihova realizacija u toku. Slična situacija je bila i sa školskim salama, iako su nešto ranije potpisani ugovori. Realizacija 7 projekata je u toku (vodosnabdijevanje i tri školske sale). Jedan projekat nije realizovan zbog prevelike vrijednosti u odnosu na planirana i obezbjeđena sredstva (Izgradnja dodatnog školskog prostora, učionica), dok jedan projekat nije realizovan zbog čekanja na sanaciju klizišta i izgradnju propusta (MZ Trepče).

Projekti čija je realizacija u toku su po svom obimu i vrijednosti veći i značajniji projekti, a vezani su i za druge izvore finansiranja, pa zato ne mogu ni biti realizovani u jednoj godini (vodovod Raduša, Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šije, Izgradnja bunara za vodovod Mrkotić, školske sale).

Finansijski Plan kapitalnih investicija za 2019. godinu je iznosio oko 3.068.000 KM (uključujući sredstva građana, viših nivoa i drugih izvora finansiranja) od čega je realizovano ili u toku oko 2.517.758,75 KM.

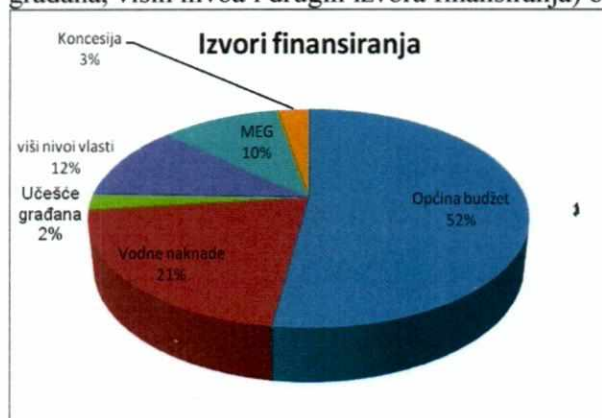

Značajno bi bilo spomenuti učešće građana u finansiranju projekata u kojima su imali učešće koje je u najvećem dijelu realizovano direktno prema izvođačima. U tabeli (napomeni) su predstavljeni iznosi prema informacijama i podacima koje smo imali, tako da ukupan iznos i realizacije ne sadrži finansijski dio koji se odnosi na učešće građana. Bilo je i izmjena u projektima. Izmjene su vršene na zahtjev mjesnih zajednica i uz odobrenje Općinskog načelnika.

Postoje i drugi projekti koji su realizovani ili je u toku njihova realizacija, ali ovdje nisu predstavljeni, jer su usvojeni kroz rebalans budžeta i direktno uvršteni u budžet. Izvještavanje za ove projekte će biti kroz Izvještaj o budžetu.

Prilog:

1. Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2019. godinu,

OBRADIVAČ:
POMOĆNIK
OPĆINSKOG NAČELNIKA



PREDLAGAČ:

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Suad Huskić

Broj: 03-45-2-75 /20

Datum: 21.01.2020. god.



Izveštaj Investicije 2019.

PRILOG

IZVJEŠTAJA o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu

iz sredstava budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu utvrđenih na poziciji Kapitalna ulaganja (Plan kapitalnih investicija) Ekonomski kod 615000 i 821000-prva kolona iz Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu, ugovoreni iznosi, informativno podaci o ulaganjima mjesnih zajednica ili grupa građana direktno, te informativno raspored drugih sredstava (sredstva budžeta, vodne naknade, učešće građana, podrška projektima iz drugih izvora i utrošak sredstava od koncesija]

A) Mjesne zajednice

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan za 2019. godinu. Plan uključuje sredstva građana, viših nivoa vlasti, budžet Općine i drugo.	Ugovoreno/ Realizacija putem budžeta	Status	Napomena
1	Bobare-Drinčići-	Dio duga MZ-ice	13.000,00	13.000,00 KM	Realizovano	Realizovano
2	Bobare-Drinčići-Blaževci	Asfaltiranje puta Križ-Blaževci	32.000,00	35.429,83 KM	Realizovano	Realizovano
3	Bukva	Asfaltiranja puta Beše- Navrboci	17.000,00	13.496,25 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem 4.500 KM
4	Bukva	Nastavak asfaltiranja Dubaljskog puta	8.000,00	8.826,51 KM	Realizovano	Realizovano
5	Đobropolje-Mekiš	NC Mujezinovići	19.000,00	15.252,29 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem 5.000 KM
6	Džemilić Planje	Asfaltiranje puta Smreče-Škola	15.000,00	10.023,44 KM	Realizovano	Realizovano
7	Džemilić Planje	Izgradnja distributivne vodovodne mreže	90.000,00	114.325,55 KM	U toku	Realizacija u toku. Obzirom da su ovdje planirana sredstva od vodnih naknada a implementacija je kasnila zbog ZDK, ugovor je potpisan relativno kasno. Učešće MZ u iznosu od 40.000 KM je dio Ugovora
8	Jablanica	Asfaltiranje puta Ripna	13.000,00	9.905,45 KM	Realizovano	Realizovano
9	Jablanica	Asfaltiranje dijela puta Kalabića kamen	8.000,00	5.055,57 KM	Realizovano	Realizovano
10	Jelah	Nastavak izgradnje novog puta	30.000,00	19.901,70 KM	Realizovano	Realizovano
11	Jelah	Asfaltiranje puteva u Mračaju-Potočani (NC304 i NC 300)	15.000,00	16.895,43 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem 10.000 KM

Izveštaj Investicije 2019.

12	Jelah	Izgradnja dodatnog školskog prostora (učionica)	150.000,00	0,00 KM	Nerealizovano	Nerealizovano. Stoji zbog Ministarstva, imamo namjenskih 30.000 KM
13	Jevadžije	NC Karahodžići asfaltiranje IV faza	15.000,00	9.956,29 KM	Realizovano	Realizovano
14	Kalošević	Sanacija objekata MZ (Dom i zgrada MZ)	15.000,00	17.521,33 KM	Realizovano	Realizovano
15	Kalošević	Asfaltiranje puta Križ-Kalošević (dionica kroz Kneževiče)	40.000,00	30.045,60 KM	Realizovano	Realizovano
16	Karadaglije	Pješačka staza džamija Kiseljak	22.000,00	11.653,20 KM	Realizovano	Na zahtjev MZ Karadaglije rađena su navedena dva projekta sa definisanim rasporedom sredstava. Sredstva građana 10.000 KM direktno sa izvođačem.
17		Asfaltiranje puta Džanići-Huskići		13.673,74 KM	Realizovano	
18	Krašvo	Presvlaka asfalta NC Donja mahala	17.000,00	19.115,77 KM	Realizovano	Realizovano
19	Ljetinić	Asfaltiranje puta Čamdžići-Ljeskovac	15.000,00	11.161,80 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem 3.500 KM
20	Medakovo	Asfaltiranje puta Salkanovići desni krak	35.000,00	30.056,04 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem 9.050 KM
21	Miljanovci-Lončari	Izgradnja objekta DZ – ambulanta	40.000,00	86.251,80 KM	Realizovano	Realizovano uključujući sredstva iz rebalansa budžeta.
22	Novi Miljanovci	Projekat rješavanja prostora za ambulantu	40.000,00	39.417,24 KM	Realizovano	Realizovano
23	Mrkotić	Izgradnja bunara za vodovod Mrkotić	120.000,00	106.766,47 KM	U toku	U toku radovi. Ugovor potpisan u decembru 2019. godine.
24	Novo Selo	Izgradnja i asfaltiranje NC Trnovac Barići	20.000,00	20.000,00 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem 12.000 KM
25	Orašje Planje	Poslovni objekat za potrebe MZ	23.000,00	22.244,00 KM	Realizovano	Realizovano
26		Uređenje oko poligona -ograda	23.000,00	2.995,00 KM	Realizovano	Na zahtjev MZ Karadaglije rađeni su navedeni projekti sa definisanim rasporedom sredstava. Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem
27	Piljužići	Uređenje novih prostorija MZ-radovi		6.996,42 KM	Realizovano	
28		Uređenje novih prostorija MZ-oprema		2.599,74 KM	Realizovano	
29		Put Sole-Pilavi-Zovke		6.231,34 KM	Realizovano	

Izveštaj Investicije 2019.

30	Raduša	Izgradnja vodovoda Raduša, razvoj mreže	715.000,00	726.577,46 KM	U toku	Realizacija u toku. Plus dodatnih 18.000 KM sredstava iz koncesija
31	Rosulje	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Agići-Bajina glava	20.000,00	15.617,27 KM	Realizovano	Realizovano
32	Šije	Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šije	130.000,00	86.872,50 KM	U toku	Potpisan ugovor u decembru i realizacija u toku, kašnjenje zbog sredstava od viših nivoa vlasti. (vodne naknade)
33	Tešanj	Ul. Srebrenička (Ahmetagića put)	31.000,00	33.297,64 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem
34	Tešanj	Asfaltiranje puta Bečari-Sejmenpolje	27.000,00	22.162,44 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem
35	Tešanj	Ul. Skendera Kulenovića-prema Hirkićima	10.000,00	7.709,94 KM	Realizovano	Realizovano. Učešće građana direktno sa izvođačem 2.982 KM.
36	Tešanjka	Korito rijeke Tešanjke uređanja	53.000,00	4.446,00 KM	Realizovano	Urađen projekat, izvođenje i realizacija planirana kroz izgradnju koridora Vc obzirom da je izvjesno u narednom periodu.
37	Trepče	Asfaltiranje puta Trepče-Šije	38.000,00	29.875,60 KM	Realizovano	Realizovano
38	Trepče	Put Zlatiči-Luka-Kotoriči	52.000,00	18.708,30 KM	U toku	Provođene druge aktivnosti na navedenoj lokaciji (sanacija klizišta). Čekalo se sticanje uslova za asfaltiranje. Realizacija projekta će biti kada dozvole vremenske prilike. Općina potpisala ugovor za planirana sredstva a učešće mještana će ići direktno.
39	Vukovo	Asfaltiranje puta stara cesta-Bjelanovići-Agići	17.000,00	17.575,21 KM	Realizovano	Realizovano
		Total:	1.928.000,00 KM	1.661.640,16 KM		

Izveštaj Investicije 2019.

B) Projekti od općeg interesa

Red br	Projekti općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan	Ugovoreno/ Realizacija putem	Status	Napomena
1	opći značaj	Rekonstrukcija raskrsnice Jelah	200.000,00 KM	0,00	U toku	U toku je novo projektovanje, problem lokacije rezervoara od benzinske
2	opći značaj	Uređenje obale rijeke Usore u Jelahu	150.000,00 KM	148.513,13	Realizovano	Sredstva Agencije sliv rijeke Save
3	Školsko područje Jablanica i Karadaglije	Izgradnja školskih sala	690.000,00 KM	157.584,46	U toku	Realizacija u toku, trenutno oko 80% realizovano.
4	Školsko područje Kalošević, Mrkotić i Bobare			232.128,00	U toku	
5	Školsko područje Piljužići, Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovci			232.713,00	U toku	
		Total:	1.040.000,00 KM	770.938,59 KM		

C) Projekti solidarnosti

Red br	Projekti solidarnosti	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan	Ugovoreno/ Realizacija putem budžeta	Status	Napomena
1	Solidarnost	Trasiranje novih puteva	20.000,00 KM	15180	Realizovano	Realizovana tri projekta
2	Solidarnost	Obaveze po zaključcima Vijeća	10.000,00 KM	0		
		Total:	30.000,00 KM	15180		

Izveštaj Investicije 2019.

D) Koncesije i dodatna sredstva

Red br	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan	Ugovoreno/ Realizacija putem budžeta	Status	Napomena
1	Raduša	Vodovod Raduša	18.000,00 KM	18.000,00	U toku	Sredstva uključen u projekat vodovoda
2	Orašje Planje	Izgradnja puta Planje-Mrkotić	27.000,00 KM	27.000,00	Realizovano	Realizovano
3	Karadaglije	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	25.000,00 KM	25.000,00	Realizovano	Realizovano
		Total:	70.000,00 KM	70.000,00		
		SUM / TOTAL	Plan ukuno	Ugovoreno/ Realizacija putem budžeta		
		SVEGA A+B+C+D:	3.068.000,00 KM	2.517.758,75		

Napomena: Razlike u ukupnom Planu i Realizaciji ima u nekoliko projekata koji nisu realizirani, a još tu razliku prave i sredstva od učešća građana koja su u većini slučajeva implementirana na način da su građani direktno ugovarali i plaćali izvođačima a ne preko budžeta Općine.

