



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ

Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2027

Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike



IZVJEŠTAJ

O OSTVARENJU PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TEŠANJ ZA 2021. GODINU

Broj: 08-24-2-524/22

Datum: 28.02.2022. godine

IZVRŠNI SAŽETAK

Planom implementacije za 2021. godinu predviđeno je uvođenje u implementaciju 2 nova projekta a planirana sredstva za te projekte su u vrijednosti 200.000,00 KM (i nastavak projekata započelih a ne završenih u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini). U 2018. godini započeta je implementacija 59 projekata, u 2019. godini 19 novih projekata a u 2020. godini su trebala započeti 4 nova projekta (započeta su dva a za druga dva se nisu stvorili preduslovi) i u 2021. godini trebala su započeti dva nova projekta.

Tabela 1. Novi projekti planirani u 2021. godini

Sektor/Program	Iznos/Plan
3.3.2.2. Projekti iskorištenja solarne energije	100.000 KM
3.3.2.3. Izgradnja vjetrenjača	100.000 KM

Projekti 3.3.2.2. i 3.3.2.3. su imali akcioni plan u 2021. godini ali se gotovo ništa nije uradilo i oba projekta su u kašnjenju. Dobra vijest je što je državna korporacija ELEKTROPRIJENOS, koja vodi i finansira projekat izgradnje 110 kV TS (trafo stanice), pokrenula nabavku pri samom kraju 2020. godine (Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Jelah u iznosu od **1.200.00 KM** i Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jelah sa priključnim DV u iznosu od **4.804.806 KM**), a krajem 2021. godine je počela gradnja ovog izuzetno važnog projekta za našu opštinu.

Pored prethodnog, ključna odstupanja koja ostaju nakon četverogodišnjeg perioda su:

- 1.1.1.1. Osnivanje tehnološkog centra (lokalno)
- 1.1.1.4. Osnivanje moderne otkupne stanice za poljoprivredne proizvode
- 1.2.1.3. Izgradnja dalekovoda Tešanj-Jelah
- 1.2.1.4. Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah (lokalno i ZDK)
- 1.2.1.6. Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama (lokalno)
- 1.2.1.7. Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put (FBiH)
- 1.2.1.8. Izgradnja nove poslovne zone (lokalno)
- 1.3.1.3. Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika (lokalno)
- 2.1.1.4. Izgradnja objekta „Gimnazije“ (ZDK)
- 2.1.1.5. Izgradnja muzičke škole (ZDK)
- 2.1.1.7. Izgradnja zatvorenog bazena (lokalno)
- 2.1.1.10. Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474) (FBiH/ZDK)
- 2.1.1.12. Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka) (FBiH)
- 2.1.1.13. Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci (lokalno)
- 2.1.1.14. Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj (lokalno)
- 2.1.1.20. Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću (FBiH)
- 2.2.1.1. Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva (lokalno)
- 2.3.1.4. Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornosti (lokalno)
- 3.2.1.2. Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje) (lokalno)
- 3.2.2.4. Rješavanje opasnog otpada (lokalno)

Ukupna vrijednost implementiranih projekata u 2021. godini je: 2989 TKM, što je 32,88% godišnje realizacije u odnosu na planirani budžet planiranih aktivnosti u 2021. godini. Zbog kompleksnosti finansiranja iz drugih izvora, a u cilju fokusa na ono što se ima direktan uticaj i na uvid u ono što nema veliki uticaj, urađeno je strukturiranje projekata s novim statusom što će biti u izvještaju i predstavljeno gdje bude potrebno:

- lokalni (lokalni izvori finansiranja: budžet JLS, općinske javne ustanove i preduzeća, građani, privreda)
- kantonalni (budžet ZDK)
- federalni (budžet FBiH, javne ustanove i preduzeća na nivou FBiH, fondovi FBiH)
- državni (budžet BiH, državne korporacije)
- mješoviti (zajednički sufinansiranje)

Tabela 2. Pregled planiranog budžeta prema aktivnostima i realizacija

Sektor	Plan Budžet - Aktivnosti 2021	Realizacija Budžet - Aktivnosti 2021	Ugovoreno u realizaciji
EKONOMSKI SEKTOR	644.400 KM	543.614,09 KM	5.500.000,00 KM
DRUŠTVENI SEKTOR	3.373.170 KM	716.798,86 KM	498.000,00 KM
SEKTOR OKOLINE	5.073.349 KM	1.729.157,64 KM	2.786.000,00 KM
Grand Total	9.090.919,00 KM	2.989.570,59 KM	8.784.000,00 KM

U pogledu uticaja realizacije projekata iz Strategije na dostizanje vizije: *Tešanj: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike* se može konstatovati da ključni projekti iz Strategije razvoja koji bi trebali uticati na inovativnu poduzetnost i društvenu etiku trebaju veći entuzijazam i širu podršku.

1. Uvod

Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Tešanj (2018-2027) ima za cilj da potakne sve zainteresovane strane na veću uključenost i doprinos u cilju povećanja fokusa na projekte iz Strategije razvoja. Ovaj izvještaj daje pokazatelje za 2021. godinu, te određenu sliku prijednog puta nakon četiri godine kao osnov za diskusiju radi kritičkog preispitivanja u najboljem interesu i naučenih lekcija s ciljem da se izmijeni ili dopuni ono što je potrebno, da se prilagode procesi, organizacija i snažnije alociraju resursi na projekte koji će brže voditi ostvarenju službeno opredjeljene vizije općine Tešanj.

2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

2.1. Vizija

Strategijom razvoja općine Tešanj za period 2018 – 2027. godine, definisana je sljedeća vizija:

Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

2.2. Strateški ciljevi

Strategijom razvoja općine Tešanj za period 2018 – 2027. godine, definisana su tri strateška cilja:

Strateški cilj 1: Tešanj, poželjno mjesto za investicije

Strateški cilj 2: Tešanj, sredina ugodnog življenja, pogodna da vrline, znanja i vještina mladih dođu do izražaja

Strateški cilj 3: Tešanj sredina ekološke svijesti, zaštite okoliša i iskorištenja vodnih resursa

2.3. Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1: Unaprijediti sektor ekonomije sa visokim dodatnim vrijednostima, razvijenim lancem snabdijevanja i visokim stepenom investiranja

Sektorski cilj 2: Privući domaće i strane investitore uređenom poslovnom infrastrukturom.

Sektorski cilj 3: Kreirati atraktivno područje za rad i razvijanje ljudskih resursa na području općine Tešanj.

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: Unaprijediti javnu infrastrukturu, uz ravnomjeran razvoj ruralnih i urbanih područja.

Sektorski cilj 2: Kreirati poticaje za razvijanje (atmosfere) društvenog aktivizma

Sektorski cilj 3: Uključiti građane općine u izgradnju sistema zajedničkih vrijednosti.

Sektorski cilj 4: Poboljšati mogućnosti za zapošljavanje, razvoj poduzetništva i društvenog aktivizma mladih.

Sektorski cilj 5: Unaprijediti kvalitet života mladih u oblasti obrazovanja, sporta i kulture.

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

Sektorski cilj 1: Poboljšati kvalitet usluge vodosnabdijevanja te povećati količine vode i proširiti obuhvat.

Sektorski cilj 2: Unaprijediti sistem zbrinjavanja komunalnog otpada i otpadnih voda.

Sektorski cilj 3: Poboljšati kvalitet zraka na području općine.

2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period

Ključni prioriteti ekonomskog sektora

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2021. godinu trebali su biti projekti koji doprinose rastu proizvodnje, rastu broja zaposlenih, rastu investicija i kretanje ka naprednim tehnologijama. Fokuiranjem na projekte iz ekonomskog sektora trebalo bi unaprijediti poslovnu infrastrukturu ali i soft područje koje je isto tako važno za dalji razvoj.

Zbog problema u funkcionisanju državne korporacije Elektroprijenos BiH tek je krajem 2021. godine počela gradnja 110 kV TS (umjesto 2018. godine). Ključni projekat u području inovativnosti: uspostava Tehnološkog centra – nakon četiri godine imamo samo izrađenu Studiju izvodljivosti za ovaj Centar. Projekat etičkih pitanja u ovom sektoru nije ni pokrenut i reduciran je na javni sektor. Nakon četiri godine nema slike nove poslovne zone, za uspostavu modela upravljanja poslovnim zonama postoje provedeni upitnici bez konkretnog prijedloga. Ovdje je evidentan pad aktivnosti.

Ključni prioriteti društvenog sektora

Ključni prioriteti su projekti iz prethodnog perioda koji utiču na rast zadovoljstva građana lokalnom upravom, administrativnim uslugama i infrastrukturuom te transparentnosti i učinku migracije mladih. Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići), započeta izgradnja nove zgrade osnovne škole u Medakovu i potpisani ugovori za realizaciju druge i treće faze, te započeta izgradnja novog objekta Centra za socijalni rad.

Društveni sektor je sam po sebi veoma širok te je broj projekata i mjera u 2021. godini (za 33 projekata su planirane aktivnosti - akcioni planovi a za neke projekte su izostavljene planirane aktivnosti u 2021. godini zbog nedostatka finansijske podrške iz predviđenih izvora finansiranja: objekat Gimnazije, Muzičke škole, Zatvoreni bazen, trotoari na M17 i M4, priključak poslovnih zona na M4, raskrsnica Tešanjka i slično). Stoga je ovdje teško fokusirati najvažnije, ali to je društvena infrastruktura kroz izgradnju ili unapređenje putnih komunikacija te podrška mladima. I ovdje treba istaći spor razvoj soft područja društvenih odnosa kroz projekte koji su vezani za razvoj etičkih društvenih vrijednosti ali ovoga puta primarno zbog epidemije Covid19.

Ključni prioriteti sektora okoliša

U sektoru okoliša za 2021. godinu ključni prioriteti su iz prethodnih godina, projekti vodosnabdijevanja (ovaj projekat je posebno aktualiziran nakon perioda u 2021 godini kada smo imali redukcije i nedostatak vode), odvodnje otpadnih voda, projekti koji vode ka smanjenju gubitaka u vodovodnoj mreži, proširenju obuhvata zbrinjavanja otpada, smanjenju zagađenosti vazduha, zemljišta i vode te povećanju iskorištenosti energije iz alternativnih izvora. Proširenje mreže toplifikacije je urađeno sa planiranim aktivnostima. Projekat rekonstrukcije centralnog grijanja uz mogućnost obnovljivih izvora energije je kandidovan putem Fonda za okoliš FBiH kod Vlade Republike Češke i nalazi se u fazi odgođene aktivnosti zbog pandemije Covid19.

Za 20 projekata su izrađeni planovi aktivnosti za 2021. godinu (akcioni planovi). Sektor okolinske zaštite je finansijski najzahtjevniji jer je uključio nastavak rješavanja ključnih prioriteta: proširenje vodoizvorišta i vodosnabdijevanja, odvodnja otpadnih voda, zbrinjavanje svih vrsta otpada i proširenje obuhvata zbrinjavanja. Iz sektora okoliša za 2021. godinu su planirana dva nova projekta (Projekti iskorištenja solarne energije i Izgradnja vjetrenjača) međutim nije se uradili ništa po pitanju ova dva projekta.

2.5. Zbirni pregled projekata obuhvaćenih implementacijom 2018-2021. godinu te Plan implementacije 2022

Operativni dio Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2027 je obuhvatio 86 projekata i mjera za period 2018-2022, tj. za petogodišnji period s tim što je na godišnjem nivou pripremana trogodišnja projekcija. Sada smo u situaciji da nemamo 2023. godinu nego praktično imamo godišnju projekciju u vezi sa dokumentom Strategije. Za planski period 2018-2021. godine ukupno je planirano 84 projekta i mjere. Posmatrajući po periodima može se vidjeti da je sa 31.12.2021. godine završeno devet projekata (Tabela 3.). S druge strane, imamo 23 projekta koji su u zastoju iz raznih razloga (Tabela 4.). U toku sa određenim stepenom završenosti se nalazi 50 projekata ili mjera. Ovo ukazuje na neadekvatno planiranje početka i završetka projekata i mjera prilikom izrade i usvajanja ove Strategije razvoja. Obzirom da se radilo o novoj metodologiji, onda je očigledno bilo određenih nespozazuma u razumijevanju.

Tabela 3. Završeni projekti_ostala samo evaluacija na godišnjem nivou zbog praćenja indikatora

Oznaka	Projekti	Plan početak	Plan kraj	Sektor	Završen	Status	Godišnja aktivnost
1.1.1.2.	1.1.1.2. Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)	2018	2022	ES	100%	završen	evaluacija
1.1.1.3.	1.1.1.3. Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima	2018	2022	ES	100%	završen	evaluacija
1.2.1.5.	1.2.1.5. Izrada mobilne aplikacije za praćenje infrastrukturnih dešavanja na područjima industrijskih zona	2018	2018	ES	100%	završen	evaluacija
2.1.1.3.	2.1.1.3. Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)	2018	2022	DS	100%	završen	evaluacija
2.1.1.11.	2.1.1.11. Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474)	2018	2019	DS	100%	završen	evaluacija
2.2.1.3.	2.2.1.3. Projekti „Sportom do zdravlja“	2018	2018	DS	100%	završen	evaluacija
2.2.1.5.	2.2.1.5. Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte	2018	2022	DS	100%	završen	evaluacija
3.2.2.5.	3.2.2.5. Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajac	2018	2022	SE	100%	završen	evaluacija
3.2.2.6.	3.2.2.6 Izrada plana upravljanja otpadom	2018	2020	SE	100%	završen	evaluacija

Tabela 4. Projekti koji su u zastoju

Oznaka	Projekti	Plan početak	Plan kraj	Sektor	Završen	Status
1.1.1.1.	1.1.1.1. Osnivanje tehnološkog centra	2018	2022	ES	10%	zastoj
1.1.1.4.	1.1.1.4. Osnivanje moderne otkupne stanica za poljoprivredne proizvode	2020	2022	ES	0%	zastoj
1.1.1.7.	1.1.1.7. Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište	2018	2022	ES	10%	zastoj
1.2.1.3.	1.2.1.3. Izgradnja dalekovoda Tešanj-Jelah	2020	2022	ES	0%	zastoj
1.2.1.6.	1.2.1.6. Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama	2018	2018	ES	30%	zastoj
1.2.1.7.	1.2.1.7. Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put	2019	2022	ES	0%	zastoj
1.2.1.8.	1.2.1.8. Izgradnja nove poslovne zone	2019	2022	ES	0%	zastoj
1.2.1.9.	1.2.1.9. Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić	2018	2022	ES	0%	zastoj
1.3.1.2.	1.3.1.2. Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova	2018	2022	ES	0%	zastoj
2.1.1.4.	2.1.1.4. Izgradnja objekta „Gimnazije“	2019	2022	DS	5.00%	zastoj
2.1.1.5.	2.1.1.5. Izgradnja muzičke škole	2019	2022	DS	10%	zastoj
2.1.1.7.	2.1.1.7. Izgradnja zatvorenog bazena	2019	2020	DS	5.00%	zastoj
2.1.1.10.	2.1.1.10. Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)	2018	2020	DS	0%	zastoj
2.1.1.12.	2.1.1.12. Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)	2018	2020	DS	10%	zastoj
2.1.1.13.	2.1.1.13. Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci	2018	2022	DS	30%	zastoj
2.1.1.14.	2.1.1.14. Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj	2018	2022	DS	30%	zastoj
2.1.1.16.	2.1.1.16. Izgradnja Doma kulture u Jelahu	2020	2022	DS	0%	zastoj
2.1.1.20.	2.1.1.20. Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću	2018	2022	DS	0%	zastoj
2.2.1.1.	2.2.1.1. Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva	2019	2022	DS	10%	zastoj
2.3.1.5.	2.3.1.5. Socijalno uključivanje i podrška socijalno osjetljivim osoba koje ne mogu pristupiti tržištu rada	2019	2022	DS	10%	zastoj
3.2.1.2.	3.2.1.2. Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje)	2018	2022	SE	0%	zastoj
3.3.2.2.	3.3.2.2. Projekti iskorištenja solarne energije	2021	2022	SE	0%	zastoj
3.3.2.3.	3.3.2.3. Izgradnja vjetrenjača	2021	2022	SE	0%	zastoj

Tabela 5. Projekti od kojih se odustalo kroz prethodne izvještaje prema Općinskom vijeći

Oznaka	Projekti	Plan početak	Plan kraj	Sektor	Završen	Status	Planirane aktivnosti 2020
2.1.1.17.	Rekonstrukcija korita na rijeci Tešanjci (Trg A. Izetbegovića), zbog dobivenog stručnog mišljenja koje je iznijelo negativnu ocjenu mogućnosti rekonstrukcije,	2018	2022	ES	0%	Odustalo se	ne
2.4.1.2.	Fond za stipendiranje talentovanih sportista, zbog ocjene da se isti realizuje kroz redovnu dodjelu stipendija	2018	2022	ES	0%	Odustalo se	ne
2.4.2.3.	Poticajne mjere za prvo zaposlenje	2018	2022	ES	0%	Odustalo se	ne
3.3.1.4.	3.3.1.4. Edukacija o značaju planskog pošumljavanja i realizacija u praksi	2018	2022	ES	0%	Odustalo se	ne


Od četiri projekta i mjere se odustalo (Tabela 5.) jer se pri pokušaju implementacije istih došlo do saznanja koja su opravdala odustajanje.

Slijedi pregled (Tabela 6. i Grafikon 1.) rasporeda svih projekata sa aktuelnim statusom i periodom predviđenog trajanja, tj. godinama početka i završetka projekta.

Tabela 6. Pregled aktuelnog statusa broja projekata u odnosu na predviđeni period realizacije

Od - Do	završeni	odustalo se	u toku	zastoj	ukupno
2018-2018	1			1	2
2018-2019	2				2
2018-2020	1		1	2	4
2018-2022	4	3	37	8	52
2019-2020				1	1
2019-2022		1	11	6	18
2020-2022			1	3	4
2021-2022				2	2
2019-2018	1				1
Grand Total	9	4	50	23	86

Grafikon 1. Pregled aktuelnog statusa broja projekata u odnosu na predviđeni period realizacije

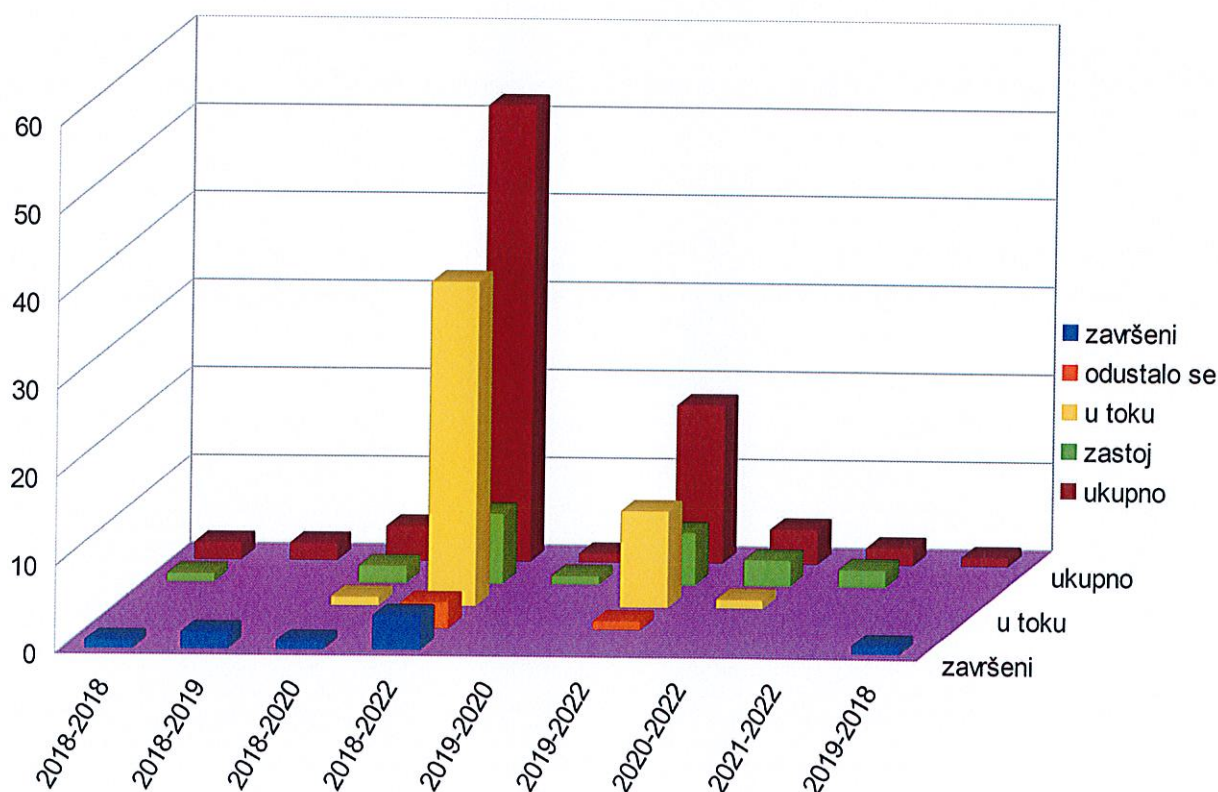

Plan implementacije Strategije razvoja općine Tešanj za period 2021-2022 praktično obuhvata 63 mjera i projekata. Vremenski rok za završetak ovih mjera i projekata je kako slijedi:

Jedan projekat je trebao biti završen 2018. godine:

- 1.2.1.6. Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama

Četiri projekta su trebala biti završena 2020. godine:

- 3.2.2.2. Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje)

- 2.1.1.7. Izgradnja zatvorenog bazena

- 2.1.1.12. Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)

- 2.1.1.10. Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)

Preostalih 58 projekata i mjera trebala bi biti završena 2022. godine.

2.5. Zbirni pregled po sketorima sa akcentom na realizaciju u 2021. godini

Po sektorima to izgleda kako slijedi:

A/ EKONOMSKI SEKTOR

U sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 19 mjera i projekata (1 završen u 2018. godini + 2 mjere) dok su devet projekata u zastoju. Za realizaciju ovih projekata planom aktivnosti za 2021. godinu je predviđeno 644 TKM a realizovano 543 TKM (84,35%).

Tabela 7. Pregled plana finansiranja i realizacije po projektima

EKONOMSKI SEKTOR	PLAN aktivnosti 2021	Realizacija	Ugovoreno u realizaciji
1.1.1.2. Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)	0	75.900,00	
1.1.1.5. Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola	2.000,00	974,09	
1.1.1.7. Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište	25.000,00	0,00	
1.2.1.1. Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem	300.000,00	18.840,00	
1.2.1.2. Izgradnja 110KVTS stanice Jelah	0,00	100.000,00	5.500.000,00
1.2.1.4. Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah	303.900,00	345.900,00	
1.3.1.1. Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola	13.500,00	2.000,00	
UKUPNO	644.400,00	543.614,09	5.500.000,00

B/ DRUŠTVENI SEKTOR

U sklopu društvenog sektora je planirano ukupno 46 mjera i projekata (četiri završeno i od tri projekata se odustalo). U zastoju je 11 projekata.

Za realizaciju ovih mjera i projekata menadžeri projekata u planovima aktivnosti za 2021. godinu su predvidjeli 3.373 TKM. U toku 2021. godine je utrošeno 716 TKM (21,24%).

Tabela8. Pregled plana finansiranja i realizacije po projektima

DRUŠTVENI SEKTOR	PLAN po planiranim aktivnostima za 2021. godinu	Realizacija	Ugovoreno u realizaciji
2.1.1.1. Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama	52.000,00	106.620,00	
2.1.1.2. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu	750.000,00		500.000,00
2.1.1.6. Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići)	0,00	28.792,77	
2.1.1.8. Izgradnja pješačkih staza	7.000,00	6.996,60	
2.1.1.9. Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad sa adekvatnom infrastrukturom	10.000,00	116.250,00	
2.1.1.10. Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)	550.000,00		
2.1.1.12. Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjska (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjska)	1.450.000,00		
2.1.1.15. Izgradnja sportske dvorane u Jelahu	400.000,00	389.486,00	
2.1.1.18. Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru	6.000,00	6.890,00	
2.1.1.19. Deminiranje terena	30.000,00		
2.2.1.2. Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera	1.000,00		
2.2.1.4. Istraživanje prošlosti tešanjškog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine	36.800,00	2.500,00	
2.2.1.6. Edukacija: značaj zaštite kulturno-historijskog naslijeđa	1.000,00	1.000,00	
2.2.1.7. Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama	12.000,00	4.700,00	
2.3.1.1. Prevencija maloljetničke delikvencije	5.000,00		
2.3.1.2. Edukacija „Slabosti modernog društva“	3.000,00		
2.3.1.3. Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda	0,00	11.600,00	
2.3.1.6. Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lica	20.000,00	10.100,00	
2.4.1.1. Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima	1.500,00	1.500,00	
2.4.1.3. Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.	6.000,00	3.600,00	
2.4.1.4. Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)	5.000,00	2.888,00	
2.4.1.5. Dani otvorenih vrata "Dani sporta"	4.870,00	2.956,00	
2.4.1.6. Dani volonterizma i aktivizma	3.000,00	2.500,00	
2.4.2.1. Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.)	2.000,00	2.045,44	
2.4.2.2. Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije)	5.000,00	9.374,05	
2.4.2.4. Sajam zapošljavanja mladih	4.000,00	4.000,00	
2.5.1.1. Medijske kampanje o vrijednostima porodice	2.000,00		
2.5.1.2. Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja	6.000,00	3.000,00	
UKUPNO	3.373.170,00	716.798,86	500.000,00

C/ EKOLOGIJA

U sklopu ekologije je ukupno planirano 21 mjera i projekata (jedna mjera završena u 2018. godini ali se prati evaluacija a druga je završena u 2020 i također se prati evaluacija, od jednog projekta se odustalo). Tri projekta su u zastoju a ostali u toku realizacije.

Za realizaciju ovih mjera i projekata menadžeri projekata u planovima aktivnosti za 2021. godinu predvidjeli 5.073 TKM. Do kraja 2021. godine je utrošeno 1.729 TKM (34,08%).

Tabela 9. Pregled plana finansiranja i realizacije po projektima

SEKTOR EKOLOGIJE	PLAN aktivnosti 2021	Realizacija	Ugovoreno u realizaciji
3.1.1.1. Dodatne količine vode	460.000,00	610.368,55	
3.1.1.2. Smanjenje gubitaka i potrošnje vode	48.000,00	9.140,00	
3.1.1.3. Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (uključujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)	600.000,00	620.679,83	
3.1.1.4. Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdijevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima	50.000,00	35.300,00	
3.2.1.1. Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže	3.125.000,00	318.006,00	2.786.000,00
3.2.2.1. Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada	12.000,00	18.284,00	
3.2.2.2. Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje)	380.000,00		
3.2.2.3. Primarna selekcija otpada	10.000,00	44.468,95	
3.2.2.6. Izrada plana upravljanja otpadom	1.500,00		
3.3.1.1. Proširenje obuhvata toplifikacije, uključujući i Jelah	20.000,00		
3.3.1.3. Eko oaza, jezero Rastoke	55.500,00	1.000,00	
3.3.1.5. Podizanje drvoreda u urbanim sredinama	2.329,00	2.329,40	
3.3.2.1. Projekti utopljanja	148.000,00	69.580,91	
3.3.2.2. Projekti iskorištenja solarne energije	76.770,00		
3.3.2.3. Izgradnja vjetrenjača	84.250,00		
UKUPNO	5.073.349,00	1.729.157,64	2.786.000,00

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA

3.1. Sažet osvrt na prethodni finansijski period implementacije i sustizanje rokova

Nakon četiri godine realizacije Strategije razvoja općine Tešanj slijedi pregled planiranih i realizovanih sredstava na godišnjem nivou a na temelju planiranih aktivnosti na godišnjem nivou (akcionih planova menadžera projekata). Ipak i ovako predstavljeni podaci ukazuju na stepen finansijske realizacija akcionih planova menadžera projekata, odnosno Strategije razvoja u četverogodišnjem periodu u apsolutnom iznosu od 78,33%. Situacija je značajno različita od projekta do projekta kao i uzroci, ali to pitanje treba rješavati na operativnom nivou planiranja i realizacija projektnih aktivnosti kao i alokacije budžeta prilikom njegovog donošenja, te koordinacija sa višim nivoima vlasti.

Tabela 10. Pregled plana finansiranja planova aktivnosti i realizacije po godinama

4.A REALIZACIJA BUDŽETA za period utroška 01.01.2018. – 31.12.2021.				
	EKONOMSKI SEKTOR	DRUŠTVENI SEKTOR	OKOLINSKI SEKTOR	UKUPNO
Plan po aktivnostima 2018	1.241.551,00 KM	3.080.920,00 KM	5.752.110,10 KM	10.074.581,10 KM
Realizacija 2018	975.835,47 KM	2.358.187,14 KM	2.591.498,78 KM	5.925.521,39 KM
% realizacije 2018	78,60%	76,54%	45,05%	58,82%
Plan po aktivnostima 2019	424.595,00 KM	2.117.628,00 KM	1.754.150,00 KM	4.296.373,00 KM
Realizacija 2019	291.614,00 KM	1.088.114,18 KM	2.576.908,03 KM	3.956.636,21 KM
% realizacije 2019	68,68%	51,38%	146,90%	92,09%
Plan po aktivnostima 2020	1.070.174,00 KM	2.285.529,00 KM	4.643.307,73 KM	7.999.010,73 KM
Realizacija 2020	324.089,00 KM	1.373.769,04 KM	1.289.400,49 KM	2.987.258,53 KM
% realizacije 2020	30,28%	60,11%	27,77%	37,35%
Plan po aktivnostima 2021	644.400,00 KM	3.373.170,00 KM	5.073.349,00 KM	9.090.919,00 KM
Realizacija 2021	543.614,09 KM	716.798,86 KM	1.729.157,64 KM	2.989.570,59 KM
% realizacije 2021	84,36%	21,25%	34,08%	32,88%
Ugovoreno u realizaciji 2021	5.500.000,00 KM	500.000,00 KM	2.786.000,00 KM	8.784.000,00 KM
Plan po aktivnostima 2018-2021	3.380.720,00 KM	10.857.247,00 KM	16.642.916,83 KM	31.460.883,83 KM
Realizacija 2018-2021	2.135.152,56 KM	5.528.169,22 KM	7.192.923,16 KM	24.641.986,63 KM
% realizacije 2018-2021	225,84%	55,59%	63,71%	78,33%

Tabela 11. Pregled planiranih aktivnosti i status tih aktivnosti nakon četiri godine

2.A Rokovi implementacije aktivnosti planiranih za period						
01.01.2018. - 31.12.2021.						
SEKTOR	Planirano	U realizaciji	U toku	Zastoj	Zastoj – mjera poduzeta	Završena aktivnost
Ekonomski sektor	185	20	4	6	7	132
Društveni sektor	466	57	18	20	14	314
Zaštita životne sredine	231	50	35	8	4	149

Tabela 12. Pregled planiranih aktivnosti i % završenih aktivnosti nakon četiri godine


3 Stepen implementacije (2.A)		
01.01.2018. - 31.12.2021.		
SEKTOR	PLAN	Završeno % od plana
Ekonomski sektor	185	71,35%
Društveni sektor	466	69,01%
Zaštita životne sredine	231	64,50%

3.2 Strukturni pregled implementacije Strategije za 2021. godinu

Od početka realizacije Strategije razvoja u potpunosti je završeno 13 projekata i mjera (ali se nastavljaju voditi do 2022. godine kako je predviđeno planom zbog evaluacije) a od 4 projekta se odustalo što je ukupno 20,9 % od planiranih 86 mjera i projekata.


Zbog pandemije Covid19 planirane aktivnosti u 2020. godini su značajno usporene ili čak bile u potpunom zastoju, a to se također nastavilo i u 2021.godini što je cjelokupno uticalo na rezultate u 2021. godini.

Grafikon 2. Grafički prikaz implementacije broja projekata.

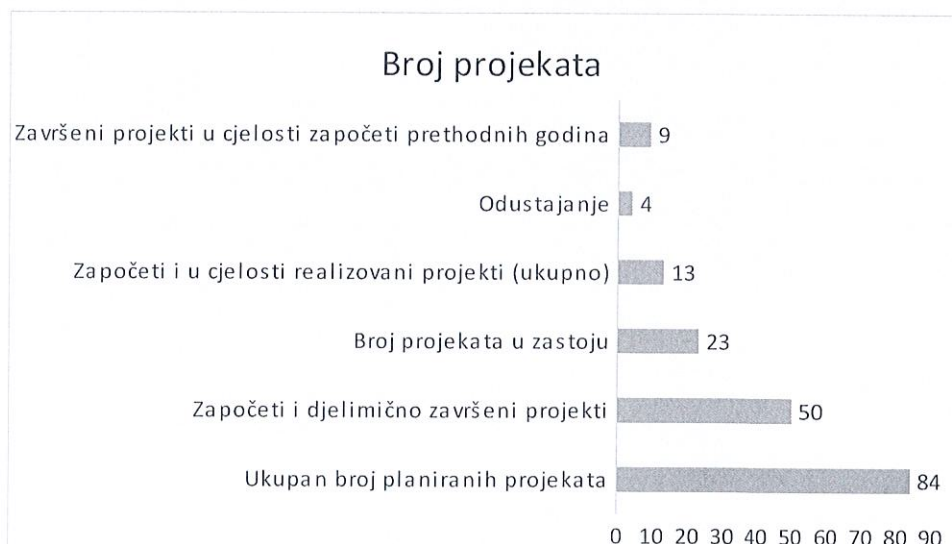

U nastavku je grafički prikaz planiranog budžeta po planiranim aktivnostima u 2021. godini po sektorima i realizacija za 2021. godinu.

Grafikon 3. Grafički prikaz planskog finansiranja i realizacije po sektorima 2021. godine

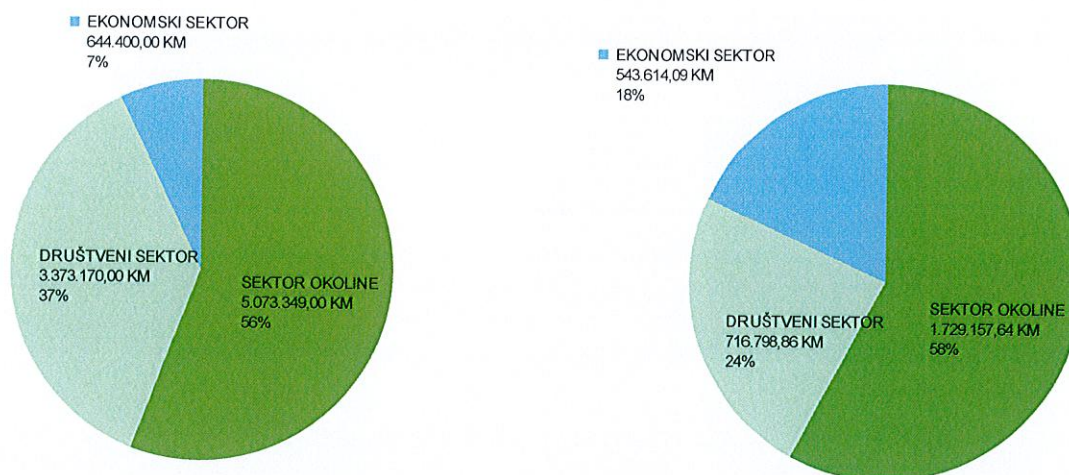

3.2.1 Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2021. godinu je aktivno 19 mjera i projekata. Tri mjera i projekata su realizovani i isti se prate sa evaluacijom na godišnjem nivou i eventualno poduzimanjem potrebnih mjera. To su sljedeći projekti:

- 1.1.1.2. Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)
- 1.1.1.3. Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima
- 1.2.1.5. Izrada mobilne aplikacije za praćenje infrastrukturnih dešavanja na područjima industrijskih zona

Devet projekata je trenutno u zastoju iz različitih razloga:

- 1.1.1.1. Osnivanje tehnološkog centra
- 1.1.1.4. Osnivanje moderne otkupne stanica za poljoprivredne proizvode
- 1.1.1.7. Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište
- 1.2.1.3. Izgradnja dalekovoda Tešanj-Jelah
- 1.2.1.6. Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama
- 1.2.1.7. Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put
- 1.2.1.8. Izgradnja nove poslovne zone
- 1.2.1.9. Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić
- 1.3.1.2. Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova

Ostalih sedam projekata su u toku i odvijaju se prema planu aktivnosti ili sa određenim kašnjenjem.

3.2.2 Društveni sektor

U sklopu društvenog sektora je planirano ukupno 46 mjera i projekata (5 završeno u 2018. (1), 2019. (3) i 2020. (1) godini a od tri projekta se odustalo). U društvenom sektoru u 2021. godini se prati 46 mjera i projekata. Sedam projekata su realizovani a od toga četiri se prate sa evaluacijom na godišnjem nivou i eventualno poduzimanjem potrebnih mjera. To su sljedeći projekti:

- 2.1.1.11. Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474)
- 2.2.1.3. Projekti „Sportom do zdravlja“
- 2.1.1.3. Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)
- 2.2.1.5. Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte
- 2.1.1.1. Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama
- 2.2.1.7. Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama
- 2.4.2.4. Sajam zapošljavanja mladih

Jedanaest projekata je trenutno u zastoju iz različitih razloga:

- 2.1.1.4. Izgradnja objekta „Gimnazije“
- 2.1.1.5. Izgradnja muzičke škole
- 2.1.1.7. Izgradnja zatvorenog bazena
- 2.1.1.10. Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)
- 2.1.1.12. Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)
- 2.1.1.13. Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
- 2.1.1.14. Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj
- 2.1.1.16. Izgradnja Doma kulture u Jelahu

- 2.1.1.20. Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću
- 2.2.1.1. Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva
- 2.3.1.5. Socijalno uključivanje i podrška socijalno osjetljivim osobama koje ne mogu pristupiti tržištu rada

Odustalo se od tri projekta po odlukama na kraju 2018. i 2019. godine:

- 2.1.1.17. Rekonstrukcija korita na rijeci Tešanji (Trg A. Izetbegovića)
- 2.4.1.2. Fond za stipendiranje talentovanih sportista
- 2.4.2.3. Poticajne mjere za prvo zaposlenje

Ostalih dvadesetpet projekata se odvija prema planu aktivnosti ili sa određenim kašnjenjem o odnosu na periode implementacije u izvornom dokumentu Strategije.

3.2.3 Sektor zaštite okoliša/životne sredine

U sektoru okoliša/ zaštite životne sredine u 2021. godini se prati 21 projekata. Dvije mjere/projekta su realizovani i isti se prate evaluacijom na godišnjem nivou i eventualno poduzimanjem potrebnih mjera. To su projekti:

- 3.2.2.5. Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajac
- 3.2.2.6. Izrada plana upravljanja otpadom

Od jedne mjere/projekta se odustalo:

- 3.3.1.4. Edukacija o značaju planskog pošumljavanja i realizacija u praksi

Tri projekat je u zastoju:

- 3.2.1.2. Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje)
- 3.3.2.2. Projekti iskorištenja solarne energije
- 3.3.2.3. Izgradnja vjetrenjača

Ostalih petnaest projekata je planirano i odvijaju se prema planu aktivnosti ili sa određenim kašnjenjem.

3.3 Ključni rezultati i ostvareni progres

Na osnovu projektnih aktivnosti može se zaključiti da su najveća sredstva angažovana na društveni sektor. Gledano kroz prizmu strateških indikatora svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu, godišnji rezultati najlakše se vide prije svega kroz realizaciju projekata kapitalnih investicija u infrastrukturu (vodovodna mreža, putna infrastruktura, uređenje poslovne zone, fiskulturne dvorane, ambulanta, toplifikacija).

U oblasti ekonomskog sektora su definisana tri strateška cilja. Pandemija Covid19 je ostavila najveći uticaj na strateške ciljeve ovog sektora. Državna korporacija ELEKTROPRIJENOS, koja vodi i finansira projekat izgradnje 110 KV TS (trafo stanice), je pokrenula javnu nabavku pri samom kraju 2020. godine (Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Jelah u iznosu od 1.200.00 KM i Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jelah sa priključnim DV u iznosu od 4.804.806 KM), a krajem 2021. godine je počela gradnja ovog izuzetno važnog projekta za našu opštinu. Općina je intervenisala dodatnim sredstvima na poticaje u poljoprivredi što nije finansijski vidljivo u projektima Strategije razvoja.

U oblasti društvenog sektora završen je projekat izgradnje školskih dvorana, ambulanti u Pousorju, započeta izgradnja zgrade osnovne škole u Medkovu te sportske dvorane u Juelahu. Društveni razvoj od planiranih 46 projekata na 32 projektu su djelimično ili u cjelosti implementirane planirane aktivnosti. Sedam projekata je završena a od toga četiri se prate sa evaluacijom na godišnjem nivou i to: Izgradnja 4 sportske dvorane, izgradnja novog mosta na rijeci Usori, sportom do zdravlja i mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte. Jedanaest projekata je u zastoju.

U oblasti okolinskog sektora su aktivnosti na smanjenju gubitaka te proširenje mreže toplifikacije. Treba istaći projekat rekonstrukcije centralnog grijanja uz mogućnost obnovljivih izvora energije je kandidovan putem Fonda za okoliš FBiH kod Vlade Republike Češke koji se nalazi u fazi ocjenjivanja. Pripremljen je i objavljen u decembru novi tender za nastavak radova na projektu izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže. Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdjevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima, izabran izvođač za izradu studije.

Shodno dosadašnjim izvještavanjima o projektima iz Strategije razvoja Općine Tešanj i svim poduzetim aktivnostima na afirmaciji iste može se zaključiti da je bilo poteškoća kod definisanja ciljeva za pojedine projekte kao i poteškoća u realizaciji istih jer nisu ovisili u konačnici samo o entuzijazmu i finansijama lokalne zajednice nego je velika podrška očekivana (nekada dobijena, češće ne) sa viših nivoa vlasti što u velikoj mjeri utiče na razvoj Općine Tešanj, kao i kašnjenja od planiranih definisanih rokova. Ono što su isključivo lokalni projekti trebaju dobiti veći fokus svih zainteresiranih strana u lokalnoj zajednici kako bi zajedničkom sinergijom realizirali zacrtano.

3.4. Horizontalna i vertikalna usklađenost i nivo integrisanosti

Horizontalna koordinacija podrazumjeva koordinirano pristupanje u procesu izrade strateških dokumenata na istom nivou vlasti, a vertikalna izradu i usklađivanje na različitim nivoima vlasti. Na osnovu prikazanih realizacija projekata i ostvarenja sektorskih ciljeva, vidljiva je međusobna integrisanost i povezanost sektorskih i strateških ciljeva. Pandemija Covid19 tokom 2021. godine nije samo otežala vertikalnu komunikaciju u realizaciji projekata nego i manja sredstva zbog pada ekonomskih aktivnosti i manjih budžetskih prihoda. U svakom slučaju je potreban veći stepen horizontalne i vertikalne koordinacije i sinergije menadžera projekata donosiocima odluka ili sa onim koji mogu imati relevantne informacije, posebno u fazi planiranja godišnjih aktivnosti.

U oktobru 2019. godine je Federacija BiH (Vlada i Parlament) su donijeli zakonske propise o planiranju razvoja na svim nivoima (FBiH, kanton, općina), strateškom planiranju, izvještavanju i evaluaciju kojom je obuhvaćena obaveza pravovremenog vremenskog usklađivanja prioriteta po vertikali. To u isto vrijeme pomjera cijeli proces planiranja unaprijed, posebno kratkoročno (1+2 godine).

3.5 Institucionalni kapaciteti općinske uprave i saradnje sa bitnim akterima

U 2021. godini je nastavljena ista organizacijska struktura predviđena Strategijom razvoja općine Tešanj 2018-2022. Vođe projekata su angažovane rješenjem Općinskog načelnika iz reda uposlenika u administraciji i javnim ustanovama i preduzećima. Samo u par slučajeva su imenovana lica iz nevladinog sektora koja su uspješno volonterski radila na realizaciji tri projekta.

U procesnom smislu je osigurana je integracija svih sudionika i zainteresovanih strana putem elektronskog portala na kome se nalazi svi godišnji planovi rada: aktivnosti, vremenski okvir i planirani budžet projekta ali i realizacija svih važnijih događaja u svakoj aktivnosti po svim projektima. Isto tako je omogućen trenutni monitoring rukovodilaca na svim nivoima, posebno pomoćnika općinskog načelnika i načelnika koji mogu bilo kada vidjeti aktivnosti koje su u kašnjenju ili zastoju i pomoći neposrednom podrškom.

Saradnja sa Partnerskom grupom je ostvorena kroz redovne sastanke i kroz uključenost Predsjedavajućeg Partnerske grupe u praćenje koordinacije realizacije Strategije sa menadžerima projekata.

Saradnja za zainteresovanim stranama tokom 2021. godine je bila u svjetlu smanjenih neposrednih kontakata, usporenih i odgođenih aktivnosti zbog pandemije Covid19.

4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizacija Strategije razvoja u 2021. godini, po strukturalnim elementima, nalazi se na sljedećem nivou:

- vremenski 58,82% (započeto od plana); 63,84% (završeno od započelih)
 - ekonomija 51,6% (započeto od plana); 50,0% (završeno od započelih)
 - društveni sektor 55,5% (započeto od plana); 71,2% (završeno od započelih)
 - ekologija 67,6% (započeto od plana); 58,3% (završeno od započelih)
- finansijski 17,16%
 - ekonomija 21,6%
 - društveni sektor 17,36%
 - ekologija 16,36%
- kvalitet (indikator)

Lokalni projekti

- vremenski 58,33% (započeto od plana); 66,66% (završeno od započelih)
 - ekonomija 52,9% (započeto od plana); 44,4% (završeno od započelih)
 - društveni sektor 58,8% (započeto od plana); 71,9% (završeno od započelih)
 - ekologija 60,0% (započeto od plana); 61,1% (završeno od započelih)
- finansijski 20,97% (u odnosu na godišnji plan budžeta i izvorni plan)
 - ekonomija 5,58%
 - društveni sektor 53,99%
 - ekologija 10,95%
- kvalitet (indikator)

Ukupan procenat planiranih aktivnosti je 58,82%, a od započelih planiranih je realizovano 63,84%, uprkos vanrednoj situaciji sa pandemijom, što ukazuje na veći stepen posvećenosti jednog broja menadžera projekata planiranim aktivnostima. Ukupan procenat finansijskih sredstava je znatno niži 10,10% („lokalni“ projekti 14,20%), iako razumljivo zbog vremenske dinamike utroška sredstava i vanrednog stanja sa pandemijom.

Jedan vremenski ciklus Strategije je pri kraju, period 2018-2022. Iako se Izvještaj primarno odnosi za period 2021. godine iz istog se može vidjeti i ukupna realizacija Strategije po različitoj strukturi: statusu projekta, aktivnostima, finansijskom pregledu itd. Imamo potrebu naglasiti nekoliko vrlo važnih činjenica:

1. Premda je pandemija na izmaku, veći dio planskog perioda je vrlo ozbiljno uticala na realizaciju Strategije razvoja (smanjenje općinskog budžeta – samo u 2020. 1.5 miliona KM, oscilacije budžeta ZDK i FBiH). Na uštrb nekih razvojnih mjera povećana su određena izdvajanja i za podršku stanovništvu. Osim smanjenja ukupnih sredstava došlo je i do ozbiljnijih promjena prioriteta u nekim područjima, npr. umjesto ulaganja u poslovnu infrastrukturu, koja su planirana našom Strategijom, FBiH i ZDK su izdvajali finansijska sredstva za podršku poslovnim subjektima zbog zastoja u radu i otežanog poslovanja.
2. U najboljoj namjeri spram lokalne zajednice i pravilnog prepoznavanja i kandidovanja prioriteta u Strategiju razvoja ugradili smo neke vrlo važne projekte za općinu Tešanj. To su jasno potvrđene potrebe lokalne zajednice (škola Medakovo, TS 110 kV Glinište, Gimnazija, magistralne ceste, ...), koje nisu direktna nadležnost općine Tešanj. Stavljajući to u Strategiju postavili smo sebi za obavezu da tražimo, insistiramo, podsjećamo, pomažemo itd da dođe do ovih projekata. Istovremeno i kada sve uradimo što je u našoj mogućnosti nema garancije da će doći do realizacije. Konkretni primjer je TS 110 Kv u Gliništu za koju je općina Tešanj uradila sve poslove iz nadležnosti još 2016. godine. Nakon toga smo pisali, zvali, lobirali itd. Radili smo sve što smo mi mogli, ali je realizacija počela u 2021. godini. S druge strane u finansijskom planu Strategije imali smo upisano 5.5 mil KM, što bitno utiče na ukupnu strukturu Strategije.
3. Neki vrlo važni poslovi i prioriteta viših nivoa vlasti, pa i općine Tešanj nisu uključeni u Strategiju, jer u tom trenutku nismo imali saznanja o tome. Konkretno, posljednje dvije godine ogroman posao u radu Općinskog načelnika i svih uposlenih je priprema za gradnju Koridora 5c (planiranje, projektovanje, finansiranje, eksproprijacija itd.). Ove aktivnosti su se odrazile i na prioritete lokalne zajednice, tako da je npr. samo za pripreme za Koridor 5c u finansijskom smislu u Budžetu planirano cca 1.2 miliona KM. U administrativnom smislu to je cca 1700 predmeta. Preko 40 miliona već provedene eksproprijacije, već isplanirano i projektovano cca 40 miliona ulaganja u infrastrukturu. Radovi trebaju početi u 2022. godini.
Npr. Strategijom smo planirali rekonstrukciju 3 raskrsnice između Tešnja i Jelaha u vrijednosti cca 400.000 KM, a od 2019. godine dogovorili, projektovali, pa evo i sredstva za otkup zemljišta pripremili, sve u vrijednosti cca 8.5 miliona KM!
U Strategiji razvoja 2018. zbog nivoa informacija i dešavanja nakon usvajanja Strategije, ništa od ovih aktivnosti i finansija nije u tom trenutku bilo planirano!

Sve izneseno nema namjeru da relativizira proces strateškog planiranja i realizacije Strategije, nego da ukaže na vrlo velike promjene, koje su se dešavale od 2018. godine! Zaključcima su predložene mjere novog operativnog planiranja u kojem ćemo koristiti postojeća iskustva i aktualne informacije i planove!

Na osnovu naučenih lekcija kroz implementaciju Strategije u toku 2022. godine, predlažu se sljedeće mjere:

1. Projekti za 2022. godinu i aktivnosti iz strategiju će se raditi po operativnom periodu 2018-2022
2. Izrada strateškog dokumenta za operativni period 2023-2027 na osnovu strategije razvoja općine Tešanj sa uvrštavanjem novih ciljeva i izmjenjeni okolnosti kao što su prostorni plan, koridor Vc itd.
3. Smjernice za trogodišnje planiranje rada za period 2023.-2025. godina
 - a) Izrada trogodišnjeg plan rada za period 2023.-2025. godina
4. Veća uključenost zainteresovanih strana
 - a) Osnažiti podršku tzv. soft-projekata (projekti iz područja etike, uključujući odnos prema osjetljivim kategorijama)
 - b) Bolja komunikacija strategije i strateških projekata kroz zajedničko vizuelno rješenje

5. ANEKSI

- Prilog_Plan aktivnosti menadžera za 2022. godinu

Dostaviti:

1. Općinsko vijeće
2. a/a



OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić

Akcioni plan za period: **01.01.2022. - 31.12.2022.**

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
1	1.1.1.4. Osnivanje moderne otkupne stanica za poljoprivredne proizvode	2020 - 2022

Menadžer: **Tamara Turkić,**

1	1	Kontaktiranje potencijalnih investitora	01.03.2022. - 31.03.2022.
2	2	Podrška u realizaciji ukoliko bude iskazan interes investitora za otkupnu stanicu	31.03.2022. - 30.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
2	1.1.1.5. Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola	2018 - 2022

Menadžer: **Dženita Hopić,**

1	1	Nabavka arduino setova sa laptopm za 4 osnovne škole	01.03.2022. - 30.04.2022.
2	2	Organizacija radionica robotike za učenike osnovnih škola	01.09.2022. - 30.11.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
3	1.1.1.7. Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište	2018 - 2022

Menadžer: **Tamara Turkić,**

1	1	Upoznavanje vlasnika zapuštenih parcela za moguću podršku za privođenje istih poljoprivrednoj proizvodnji	03.01.2022. - 30.06.2022.
2	2	Praćenje objave javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta, kant. min. i animiranje potencijalnih korisnika	03.05.2022. - 30.06.2022.
3	3	Podrška i pomoć potencijalnim korisnicima podrške	01.07.2022. - 30.07.2022.
4	4	Rješenje ministarstva o imenovanju komisije	01.08.2022. - 25.08.2022.
5	5	Izlazak komisije na teren po pristiglim prijavama	25.08.2022. - 20.12.2022.
6	6	Rješenje o odobravanju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta	20.12.2022. - 30.12.2022.
7	7	Evidentiranje novih površina obradivog poljoprivrednog zemljišta	20.12.2022. - 30.12.2022.

21.02.2022

1/18

OPĆINA TEŠANJ

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
4	1.2.1.1. Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem	2018 - 2022

Menadžer: **Haška Hundur,**

1	1	Prijava na javni poziv Ministarstva za privredu ZDK za 2022. g.	01.07.2022. - 31.07.2022.
2	2	Prijava na javni poziv FMRPO za 2022. g.	01.07.2022. - 31.07.2022.
3	3	Realizacija ugovora iz 2022. g.	01.10.2022. - 31.12.2022.
4	4	Javna nabavka-izbor izvođača za realizaciju odobrenih projekata u 2022. g.	01.10.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
5	1.2.1.2. Izgradnja 110KVTS stanice Jelah	2018 - 2022

Menadžer: **Nadir Medarić,**

1	1	Izgradnja objekta TS 110 kV	01.01.2022. - 31.10.2022.
2	2	upotrebna dozvola i početak rada	01.11.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
6	1.2.1.4. Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah	2018 - 2022

Menadžer: **Nihad Hadžismajlović, Mirel Hrvić,**

1	1	Praćenje realizacije ulivnih i izlivnih traka na raskrsnicama na dionici Tešanj-Jelah	01.02.2022. - 31.12.2022.
---	---	---	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
7	1.2.1.7. Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put	2019 - 2022

Menadžer: **Hajrudin Subašić, Selma Ramić, Nihad Hadžismajlović,**

1	1	Izrada glavnog projekta od strane federalne direkcije za ceste	03.01.2022. - 30.12.2022.
2	2	Realizacija priključka Glinište-M4	01.09.2022. - 30.12.2022.

21.02.2022

2/18

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
8	1.2.1.9. Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić	2018 - 2022

Menadžer: **Nermina Bešliagić,**

1	1	neće biti aktivnosti na navedenom planskom dokumentu dok se ne donese Prostorni plan općine Tešanj 2020-2040	27.01.2022. - 27.01.2022.
---	---	--	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
9	1.3.1.1. Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola	2018 - 2022

Menadžer: **Muamer Omahić,**

1	1	Realizacija praktične nastave za drugo polugodište 2021/2022 i kreiranje novog zanimanja i uslova za novo odjeljenje u školskoj 2022/2023	03.01.2022. - 28.10.2022.
2	2	Predstavljanje prijedloga ugovora za realizaciju praktične nastave u privrednim subjektima	10.06.2022. - 28.10.2022.
3	3	Potpisivanje ugovora između: privrednih subjekata, učenika, roditelja i škola za izvođenje praktične nastave u privrednim subjektima.	20.10.2022. - 30.11.2022.
4	4	Realizacija praktične nastave u firmama za školsku 2022/2023	10.11.2022. - 30.12.2022.
5	5	Izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti	15.12.2022. - 30.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
10	2.1.1.1. Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama	2018 - 2022

Menadžer: **Hasan Plančić,**

1	1	Definisati preliminarnu listu objekata	11.01.2022. - 15.02.2022.
2	2	Uraditi plan ulaganja i izvore finansiranja	16.02.2022. - 16.03.2022.
3	3	Provođenje procedura JN	17.03.2022. - 15.06.2022.
4	4	Praćenje realizacije	16.06.2022. - 30.09.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
11	2.1.1.2. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu	2018 - 2022

Menadžer: **Almir Ljevaković,**

1	1	Nastavak gradnje: prva ploča, zidanje, druga ploča.	21.01.2022. - 30.03.2022.
2	2	Javna nabavka za izgradnju drugog sprata sprata i krovne konstrukcije	30.03.2022. - 30.05.2022.
3	3	Izvođenje radova po prethodnoj nabavci	01.06.2022. - 01.09.2022.
4	4	Javna nabavka za utopljanje objekta (postavljanje fasade, PVC stolarije, unutrašnje uređenje, mašinske i elektroinstalacije.	01.09.2022. - 15.11.2022.
5	5	Izvođenje radova po prethodnoj nabavci	15.11.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
12	2.1.1.6. Izgradnja ambulanti u Pousozju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići)	2018 - 2022

Menadžer: **Selvedina Seimenović,**

1	1	Aktivnosti na realizaciji projekta Ambulanta Miljanovci Lončari u dijelu izgradnje i primopredaja korisniku su završene. Objekat je u upotrebi. Tehnički pregled nije završen i u obavezi je korisnika objekta.	24.01.2022. - 31.05.2022.
---	---	---	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
13	2.1.1.8. Izgradnja pješačkih staza	2019 - 2022

Menadžer: **Meho Alić,**

1	1	Izbor lokacija - Jezero Mrkotić	07.03.2022. - 18.03.2022.
2	2	Izbor izvođača radova - direktni postupak	21.03.2022. - 08.04.2022.
3	3	Izgradnja pješačke staze	15.04.2022. - 17.06.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
14	2.1.1.9. Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad sa adekvatnom infrastrukturom	2019 - 2022

Menadžer: **Sabahudin Omerbašić,**

1	1	Nastavak gradnje objekta sa aktivnostima na iznalaženju finansijskih sredstava	31.01.2022. - 01.01.2023.
---	---	--	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
15	2.1.1.10. Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)	2018 - 2020

Menadžer: **Nihad Hadžismajlović, Nadir Medarić,**

1	1	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izdavanje odobrenja za građenje	01.01.2022. - 30.04.2022.
2	2	Javna nabavka za izvođenje radova izvođenje radova na izgradnji kružnog toka u Jelahu	01.05.2022. - 15.11.2022.
3	3	Upotrebna dozvola i puštanje u upotrebu	16.11.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
16	2.1.1.12. Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)	2018 - 2020

Menadžer: **Nihad Hadžismajlović, Selma Ramić,**

1	1	Izbor idejnog rješenja	03.01.2022. - 30.06.2022.
2	2	Rješavanje eksproprijacije i izvođenje radova	04.01.2022. - 30.12.2022.
3	3	Pribavljanje odobrenja za gradnju	01.07.2022. - 30.09.2022.
4	4	Razgovori sa JP Ceste FBiH oko načina finansiranja	01.10.2022. - 31.10.2022.
5	5	Procedura JN u slučaju iznalska finansijskih sredstava	01.11.2022. - 30.11.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
17	2.1.1.13. Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci	2018 - 2022

Menadžer:**Nermína Bešliagić,**

1	1	Donošenje odluke o prihvatljivosti rješenja prikazanog u Studiji	01.02.2022. - 01.07.2022.
2	2	Definisanje projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja saobraćajnice (Tešanj)	01.07.2022. - 01.09.2022.
3	3	Definisanje projektnog zadatka za parking površine	01.07.2022. - 01.09.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
18	2.1.1.14. Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj	2018 - 2022

Menadžer:**Hajrudin Subašić, Nermína Bešliagić,**

1	1	Analiza projekta koridora Vc i tačno definisanje južnog izlaza	01.01.2022. - 31.12.2022.
---	---	--	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
19	2.1.1.15. Izgradnja sportske dvorane u Jelahu	2020 - 2022

Menadžer:**Selma Ramić, Mirel Hrvić,**

1	1	Završetak i realizacija radova iz I faze	01.02.2022. - 01.03.2022.
2	2	Realizacija Ugovora II Faza- Izvođenje radova 2022	01.02.2022. - 30.04.2022.
3	3	Primopredaja I faze radova	15.02.2022. - 15.03.2022.
4	4	Primopredaja radova II Faze	02.05.2022. - 31.05.2022.
5	5	Priprema tehničke specifikacije III faze radova za plan nabavki i provođenje procedura JN	01.06.2022. - 19.08.2022.
6	6	Potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem i nadzorom radova	22.08.2022. - 31.08.2022.
7	7	Realizacija radova iz ugovora III faza	01.09.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
20	2.1.1.16. Izgradnja Doma kulture u Jelahu	2020 - 2022

Menadžer: **Milada,**

1	1	Definisanje projektnog zadatka	03.01.2022. - 28.02.2022.
2	2	Pokretanje i provođenje postupka javne nabavke za odabir nosioca izrade plana	01.03.2022. - 30.06.2022.
3	3	Izrada nacarta plana i usvajanje istog od strane OV-a	01.07.2022. - 01.08.2022.
4	4	Provođenje javne rasprave na nacrt plana	14.10.2022. - 14.11.2022.
5	5	Izrada prijedloga plana i dostava OV -u na razmatranje	14.11.2022. - 30.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
21	2.1.1.18. Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru	2018 - 2022

Menadžer: **Aidin Ibrahimkadić,**

1	1	Testirati DocuNova e-mailing sistem na mjesnima zajednicama	01.03.2022. - 31.03.2022.
2	2	Definisati saradnju sa Centrom za socijalni rad	01.04.2022. - 30.04.2022.
3	3	Uvezati CSR i Općinu	03.05.2022. - 30.06.2022.
4	4	Evaluacija projekta	30.11.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
22	2.1.1.19. Deminiranje terena	2018 - 2022

Menadžer: **Mensur Saletović,**

1	1	Rad na terenu oko prikupljanja svih podataka za izradu MSP Jugozapad Tešanj.	01.01.2022. - 31.03.2022.
2	2	Izrada projekata deminiranja od strane BH MAC-a i delegiranje istog kompanijama na realizaciju.	01.04.2022. - 01.06.2022.
3	3	Deminiranje preostale sumnjive površine i izdavanje certifikata.	01.07.2022. - 30.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
23	2.1.1.20. Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću	2018 - 2022

Menadžer: **Nihad Hadžismajlović,**

1	1	Izrada projektne dokumentacije	01.01.2022. - 30.09.2022.
---	---	--------------------------------	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
24	2.2.1.2. Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera	2018 - 2022

Menadžer: **Mirsad Srkalović,**

PLAN AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU: 01.09.2022. - 31.10.2022.

1. Iznajmiti prostor za održavanje edukacije i ozvučenje.
2. Angažovati dva kvalifikovana predavača (trenera sa unaprijed utvrđenim i izrađenim planom rada i agendom). Treening će trajati jedan dan.
3. Uputiti poziv svim relevantnim akterima: sportskim klubovima, udruženjima i asociacijama sa sportskim predznakom, zatim ustanovama i institucijama sa područja općine Tešanj, lokalne vlasti, resornog ministarstva i drugih zainteresovanih građana za učešće na edukaciji,
4. Obezbjediti osvježenje za učesnike edukacije.
5. Uraditi medijsku promociju edukacije: Izrada plakata, obavještavanje medija, objava poziva i informacija na web-stranicama i društvenim mrežama,
6. Edukacija:
 - Teoretski dio - Izlaganje dva predavača, prezentacija preko kino projektoru,
 - Praktični dio - Izlaganje sa pokaznim vježbama, dva predavača i grupa sportista kao demonstratori vježbi
7. Medijska promocija po završetku edukacije: web-stranica Općine Tešanj, web-stranica Sportskog saveza općine Tešanj, društvene mreže.
8. Realizacija edukacije predviđena je za početak oktobra 2022. godine, dok su navedene pripreme aktivnosti predviđene za septembar 2022. godine.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
25	2.2.1.4. Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine	2018 - 2022

Menadžer: **Mensura Mujkanović,**

1	1	Snimanje i georeferenciranje stećaka na području općine Tešanj	01.03.2022. - 31.12.2022.
2	2	Arheološka postavka u Kapetanovoj/Krnja kuli na Starom gradu Tešanj	01.03.2022. - 31.12.2022.
3	3	Arheološko iskopavanje (uz konzervaciju zida) na Starom gradu Tešanj 2022.	01.07.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
26	2.2.1.7. Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama	2018 - 2022

Menadžer: **Azra Muslija,**

1	1	Pripreme Programskog savjeta za manifestacije i obilježavanje drugih značajnih datuma	20.01.2022. - 18.03.2022.
2	2	Izrada Plana kulturnih i drugih sadržaja u ruralnim sredinama	18.03.2022. - 18.04.2022.
3	3	Usaglašavanje Plana sa zainteresovanim stranama u cilju realizacije Plana	19.04.2022. - 06.05.2022.
4	4	Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	06.05.2022. - 30.11.2022.
5	5	Izvištaji o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	05.12.2022. - 23.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
27	2.3.1.1. Prevencija maloljetničke delikvencije	2018 - 2022

Menadžer: **Amir Prnjavorac,**

1	1	Utvrdjivanje broja djece sa rizičnim ponašanjem	02.02.2022. - 14.03.2022.
2	2	Definisanje plana aktivnosti	16.03.2022. - 29.03.2022.
3	3	Realizacija aktivnosti iz plana	30.03.2022. - 08.12.2022.
4	4	Evalvacija	14.12.2022. - 26.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
31	2.3.1.7. Rad sa djecom koja su izložena nasilju u porodici	2019 - 2022

Menadžer: **Amir Prnjavorac,**

1	1	Sastanak sa potpisnicima Protokola	18.02.2022. - 09.03.2022.
2	2	Monitoring/praćenje, evaulacija	10.03.2022. - 14.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
32	2.4.1.1. Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima	2018 - 2022

Menadžer: **Nedžad Unkić,**

1	1	Odabir teme za edukaciju za 2022.g., Već postoji zainteresovanost za edukaciju za 2022.g., ovisno o razvoju stanja s Covidom ponoviti aktivnosti od ranijih godina	01.01.2022. - 28.02.2022.
2	2	Izbor edukatora (Novi polaznici ista tema vjerovatno)	01.03.2022. - 31.03.2022.
3	3	Edukacija - Dati značaj i dosadašnjim učesnicima poziva radi razvoja ljudskih resursa a samim tim i realizaciji cilja - više aplikacija	01.04.2022. - 31.08.2022.
4	4	Predstavljanje kandidata koji su završili edukaciju te uručenje certifikata	01.09.2022. - 30.09.2022.
5	5	Evalucija	01.12.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
33	2.4.1.3. Priznavanje i nagradivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.	2018 - 2022

Menadžer: **Nedžad Unkić,**

1	1	Pribavljanje liste sportista koji su u prvom polugodišta ostvarili značajne rezultate (Putem Sportskog saveza)	31.05.2022. - 30.06.2022.
2	2	Donošenje Rješenja i Odluka o nagradivanju sportista te prijem i uručenje nagrada	01.07.2022. - 31.07.2022.
3	3	Shodno rezultatima u drugom polugodištu i ukupno godini izbor i nagradivanje sportista krajem godine nagrade i priznanja (Putem Sportskog saveza)	01.12.2022. - 31.12.2022.
4	4	Evalucija	01.12.2022. - 31.12.2022.

21.02.2022

11/18

OPĆINA TEŠANJ

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
34	2.4.1.4. Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)	2019 - 2022

Menadžer: **Hasan Plančić,**

1	1	Sastanak sa zainteresiranim stranama	01.02.2022. - 11.03.2022.
2	2	analiza plana i programa obuke	14.03.2022. - 31.03.2022.
3	3	Javni poziv i formiranje spiska učesnika	04.04.2022. - 29.04.2022.
4	4	Ispitivanje tržišta i izbor edukatora	09.05.2022. - 30.06.2022.
5	5	Realizacija plana Edukacija	30.06.2022. - 15.09.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
35	2.4.1.5. Dani otvorenih vrata "Dani sporta"	2018 - 2022

Menadžer: **Nusret Ogrić,**

1	1	Plan budžeta i razgovori sa zainteresovanim stranama (Sportska udruženja, škole)	01.06.2022. - 10.06.2022.
2	2	Ugovaranje načina prevoza djece do bazena	13.06.2022. - 30.06.2022.
3	3	Realizacija projekta (škola plivanja sa zabavnim igrama nogometa, košarke i odbojke na Kiseljaku). Broj dana realizacije projekta odrediti u dogovoru sa zainteresovanim stranama	01.07.2022. - 19.08.2022.
4	4	Izveštaj o realizaciji projekta	22.08.2022. - 31.08.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
36	2.4.1.6. Dani volonterizma i aktivizma	2019 - 2022

Menadžer: **Nedžad Unkić,**

1	1	Upoznavanje zajednice sa značajem volonterizma, te poziv i razgovor o temama radi obavljanja volonterskih akcija	01.01.2022. - 31.01.2022.
2	2	Izbor i realizacija najboljih volonterskih projekata, sa najvećim brojem učesnika, najboljim efektima za zajednicu,	01.03.2022. - 31.08.2022.
3	3	Evaluacija rezultata i indikatora	01.12.2022. - 31.12.2022.

21.02.2022

12/18

OPĆINA TEŠANJ

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
37	2.4.2.1. Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),	2018 - 2022

Menadžer: **Dženita Hopić,**

1	1	Organizacija obuke za 20 nezaposlenih lica za rad u programu Excel	01.10.2022. - 31.12.2022.
2	2	Organizacija obuke za 20 nezaposlenih lica za rad u programima za grafički dizajn	01.10.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
38	2.4.2.2. Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije)	2019 - 2022

Menadžer: **Muamer Omahić,**

1	1	Uraditi analizu stanja na tržištu rada i deficitarnih zanimanja	28.01.2022. - 31.03.2022.
2	2	Raspisati javni poziv za program obuka	31.03.2022. - 29.04.2022.
3	3	Realizovati program obuke	29.04.2022. - 30.06.2022.
4	4	Kreirati izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti	30.06.2022. - 30.09.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
39	2.4.2.4. Sajam zapošljavanja mladih	2018 - 2022

Menadžer: **Muamer Omahić,**

1	1	Nabavka Hostinga i SSL certifička za godinu dana	09.11.2021. - 09.11.2022.
2	2	Promocija postojeće web platforme e biro	28.01.2022. - 31.03.2022.
3	3	Promocija postojeće web platforme e biro	28.01.2022. - 31.03.2022.
4	4	Unaprijeđenje sadržaja i uvođenje novih funkcija na web platformi	31.03.2022. - 30.06.2022.
5	5	Praćenje rada web platforme i Kreiranje izvještaja o realizaciji projekta	30.06.2022. - 30.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
40	2.5.1.1. Medijske kampanje o vrijednostima porodice	2018 - 2022

Menadžer: **Edina Kadušić,**

1	1	Izrada medija plana promocije	01.01.2022. - 31.01.2022.
2	2	Realizacija medija plana promocije	01.02.2022. - 30.11.2022.
3	3	Evaluacija indikatora	01.12.2022. - 31.01.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
41	3.1.1.1. Dodatne količine vode	2018 - 2022

Menadžer: **Himzo Bošnjak,**

1	1	Izrada Idejnog i Glavnog projekta bunara PEB-5	01.01.2022. - 15.02.2022.
2	2	Rješavanje Imovinsko-pravnih odnosa za bunar PEB-5	15.02.2022. - 31.07.2022.
3	3	Ishođenje Urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje za bunar PEB-5	15.02.2022. - 31.08.2022.
4	4	Izvođenje radova na bunaru PEB-3	01.03.2022. - 31.07.2022.
5	5	Tender za izbor izvođača za bunar PEB-5	31.08.2022. - 30.11.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
42	3.1.1.2. Smanjenje gubitaka i potrošnje vode	2018 - 2022

Menadžer: **Himzo Bošnjak,**

1	1	Baždarenje vodomjera 1. kvartal/2022	01.01.2022. - 31.03.2022.
2	2	Podizanje svijesti građana o potrebi štednje vode putem štampanih letaka, brošura, lokalnih radio i TV stanica	01.01.2022. - 31.12.2022.
3	3	Saradnja sa općinskom inspekcijom na inspeksijskom nadzoru provođenja Odluke o vodovodu i kanalizaciji	01.01.2022. - 31.12.2022.
4	4	Baždarenje vodomjera 2. kvartal/2022	01.04.2022. - 30.06.2022.
5	5	Baždarenje vodomjera 3. kvartal/2022	01.07.2022. - 30.09.2022.
6	6	Baždarenje vodomjera 4. kvartal/2022	01.10.2022. - 31.12.2022.

21.02.2022

14/18

OPĆINA TEŠANJ

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
43	3.1.1.3. Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdjevanja (uključujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)	2018 - 2022

Menadžer: **Hajrudin Subašić, Selma Ramić, Mirel Hrvić,**

1	1	Izmjena prikupljenih dozvola, pribavljanje potrebne dokumentacije za upotrebnu dozvolu i probni rad	30.01.2021. - 31.01.2022.
2	2	Evaluacija ishoda	01.12.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
44	3.1.1.4. Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdjevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima	2019 - 2022

Menadžer: **Hasan H.,**

1	1	Podrška izvođaču IG Banjaluka u aktivnostima na izradi Studije. (terenske posjete, ustupljena dokumentacija, stručna podrška)	01.01.2022. - 31.12.2022.
---	---	---	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
45	3.2.1.1. Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže	2018 - 2022

Menadžer: **Mirel Hrvić,**

1	1	Nastavak projektovanja sekundarne i tercijarne mreže ugovorene iz 2015 godine	01.01.2022. - 31.12.2022.
2	2	Nastavak realizacije izvođenja radova na sekundarnoj mreži, zona I i II, Jelah polje, Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovci	01.01.2022. - 31.12.2022.
3	3	Završetak radova iz prethodne godine, spajanje postojećih ispusta na primarni kolektor	01.02.2022. - 01.03.2022.
4	4	Završetak radova iz prethodne godine, nastavak izgradnje primarnog kolektora BI	01.02.2022. - 01.03.2022.
5	5	Priprema rješenje za tehničko rješenje šaha kućnog priključka i priprema tehničke specifikacije za JN	01.02.2022. - 01.04.2022.
6	6	Tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole, spajanje postojećih ispusta na primarni kolektor	01.04.2022. - 01.06.2022.
7	7	Tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole, nastavak kolektora BI	01.04.2022. - 01.06.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
46	3.2.1.2. Izgradnja POV (uređaja za prečišćavanje)	2018 - 2022

Menadžer: **Nadir Medarić,**

1	1	rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	01.01.2022. - 31.12.2022.
2	2	iznalaženje izvora finansiranja	01.01.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
47	3.2.2.1. Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada	2018 - 2022

Menadžer: **Hasan H.,**

1	1	Podjela kanti/Sklapanje ugovora.	01.01.2022. - 31.12.2022.
2	2	Podrška i praćenje efekata rada općinske inspekcije prema Odluci o komunalnoj djelatnosti i sanitarnom minimumu. (više koordinacije i fokusa općinske inspekcije na proširenju obuhvata)	01.01.2022. - 31.12.2022.
3	3	Definisanje dugoročnog statusa MZ Šije vezano za organizovani odvoz otpada.	01.01.2022. - 31.12.2022.
4	4	Medijska kampanja- proljeće.	01.03.2022. - 31.05.2022.
5	5	Saradnja sa 5 MZ koje imaju najmanju uključenost u organizovani odvoz otpada.	01.04.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
48	3.2.2.2. Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otpinjavanje)	2018 - 2020

Menadžer: **Adnan,**

1	1	Instalaciju kolske vage na deponiji u skladu sa Glavnim projektom sanacije deponije.	01.02.2022. - 31.12.2022.
2	2	Izrada nove plohe otpada na deponiji u skladu sa Glavnim projektom sanacije deponije.	01.03.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
49	3.2.2.3. Primarna selekcija otpada	2018 - 2022

Menadžer: **Adnan,**

1	1	Apliciranje na javne pozive u cilju proširenja obuhvata odvojenog prikupljanja. (nabavka posuda)	01.01.2022. - 31.12.2022.
2	2	Praćenje efekata za domaćinstva odvojenog prikupljanja otpada PET-PAPIR-METAL.	01.01.2022. - 31.12.2022.

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
50	3.2.2.4. Rješavanje opasnog otpada	2018 - 2022

Menadžer: **Adnan,**

1	1	Praćenje realizacije organizovanog odlaganja opasnog otpada na mjesečnom nivou JU i JP.	01.01.2022. - 31.12.2022.
---	---	---	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
51	3.2.2.5. Veći stepen primijene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajac	2018 - 2022

Menadžer: **Meho Alić,**

1	1	Izrada mjesečnog pregleda ključnih pokazatelja provedbe Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu i poduzimanje mjera	03.01.2022. - 31.12.2022.
---	---	--	---------------------------

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
52	3.3.1.3. Eko oaza, jezero Rastoke	2018 - 2022

Menadžer: **Vahid Festa,**

1	1	Podnijeti zahtjev za građevinske dozvole.	01.02.2022. - 28.02.2022.
2	2	Aplicirati externalnim izvorima finansiranja.	01.02.2022. - 31.08.2022.
3	3	Obezbijediti alternativnu lokaciju za stočnu pijacu.	01.02.2022. - 30.09.2022.
4	4	Održavanje obuhvata košenjem, krčenjem, kupljenjem smeća..	01.03.2022. - 15.10.2022.
5	5	Izgraditi temelje "ribarske kuće".	01.07.2022. - 31.10.2022.
6	6	Izgraditi dječije igralište sa certificiranim rekvizitima i podlogom..	01.07.2022. - 30.09.2022.

21.02.2022

17/18

RB	Projekat	Period projekta / Period Aktivnosti
53	3.3.1.5. Podizanje drvoreda u urbanim sredinama	2018 - 2022

Menadžer: **Meho Alić,**

1	1	Definisanje lokacija novih drvoreda	01.09.2022. - 30.09.2022.
2	2	Nabavka sadnica stabala	03.10.2022. - 28.10.2022.
3	3	Kopanje rupa za sadnju i sadnja 1000 sadnica.	03.10.2022. - 31.10.2022.

RB Projekat

54 3.3.2.1. Projekti utopljanja

Period projekta / Period Aktivnosti
2018 - 2022Menadžer: **Selvedina Sejmenović,**

1	1	Realizacija projekata Energetske efikasnosti odnosno provedba mjera na utopljanju objekata osnovnih škola na području općine Tešanj. To su OŠ u Jelahu, Tešanjci i Šijama. Finansiranje je obezbijeđeno iz kreditnih sredstava Svjetske Banke a implementacija se vrši preko Federalnih i Kantonalnih ministarstava. Sredstva planirana za ove aktivnosti su 1.200.000 KM.	01.01.2022. - 31.07.2022.
2	2	Nastavak aktivnosti u LINK MREŽI. Realizacija po Idejnom projektu na izgradnji Fotonaponske elektrane za vlastite potrebe sa lokacijom na krovu Opće Bolnice Tešanj	01.02.2022. - 30.12.2022.
3	3	Realizacija mjera po usvojenom AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I BORBUI PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA-SECAP	01.02.2022. - 30.12.2022.
