



Općina Tešanj

STARI GRAD TEŠANJ - GRADINA

Općina Tešanj, februar 2011.

DNEVNI RED

- 1. ANALIZA AKTIVNOSTI IZ 2010.**
- 2. PLANOVI ZA SEZONU 2011.**
- 3. RAZNO**



GRADINA 2010.


- Početak analiza iz 2009. godine na sastanku 17.12.2009.
- *“Učesnici u raspravi su istakli zadovoljstvo realizovanim aktivnostima u 2009. godini, kao opću ocjenu, uz uočavanje područja i aktivnosti u kojima je moguće biti uspješniji.”*
- Razrađeni prijedlozi za 2010. godinu – dopuna tokom januara
- Svi imali priliku da predlažu konačan plan
- Konačan plan *GRADINA 2010* potvrđen na kabinetskom sastanku 18.01.2010.

OSNOVA PLANA 2010.

ČETIRI OBLASTI:

- INFRASTRUKTURA
- ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
- TURISTIČKI SADRŽAJ
- PROMOCIJA I KULTURNI SADRŽAJI

Ulaganja u infrastrukturu 2009.

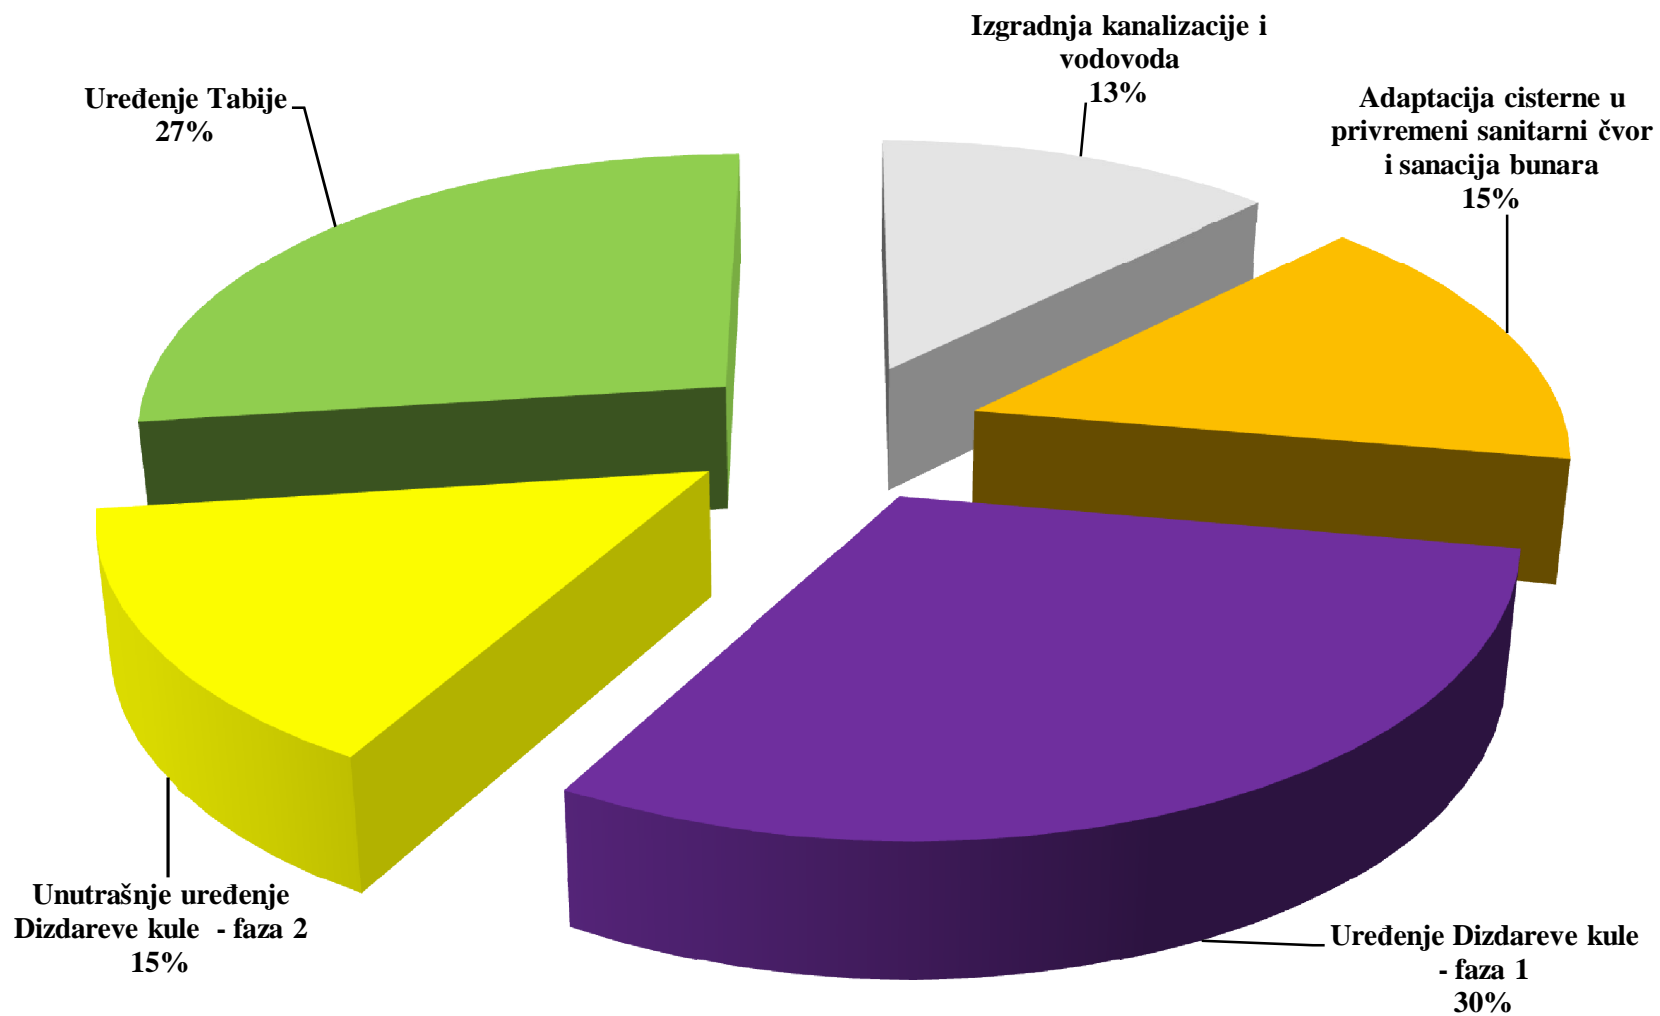

DETALJNA RAZRADA AKTIVNOSTI 2010.


OPĆINA TEŠANJ										PROJEKT GRADINA 2010		
MBS	Aktivnost	Nosilac	Start	Kraj	Trajanje (Days)	% završenosti	Plan prihoda	PROCJENA RASHODA KM	NASTALI TROŠAK	OBRAZLOŽENJE		
1	1	INFRASTRUKTURA	03.01.10.	10.08.10.	219	78%	228.595 KM	233.875 KM	158.942 KM			
10	1.1	WC do ljetne bašte	03.01.10.	01.05.10.	118	25%	30.000,00 KM	30.000 KM	0 KM	Izrađen novi prijedlog idejnog rješenja, poslat u Zavod. Dali su nam usmjerenje za glavni projekat. Predato projektantu		
11	1.2	Staze, rukohvatni	03.01.10.	01.05.10.	118	90%	5.000,00 KM	5.000 KM	737 KM	Staze su uređene prema planu, smanjena potreba za rukohvatima. Pred zimu je bilo novog uređenja staza.		
12	1.3	Zaštitna ograda	22.01.10.	10.08.10.	200	35%	15.000,00 KM	15.000 KM	375 KM	Napravljeno probno polje po instrukcijama Zavoda, nisu ga odobrili, preuzeli obavezu raditi novo rješenje. Uradili novo rješenje, nije dostavljeno za tender. Načelnik dao podršku za		
13	1.4	Inventar na platou	ISMAR	01.12.09.	15.05.10.	165	90%	26.000,00 KM	26.000 KM	23.500 KM	Rasvjeta za pozornicu stigla 6160 KM, stolice i razglas takođe. Nije adekvatno riješeno upravljanje rasvjetom i drugom opremom	
14	1.5	Krma kula_donji sprat	ISMAR	01.12.09.	15.05.10.	165	100%	15.000,00 KM	15.000 KM	24.078 KM	Radovi okončani 24. oktobra. Urađeno više od planiranog.	
15	1.6	Rasvjeta ispod velike tabije		03.01.10.	01.05.10.	118	100%	3.000,00 KM	3.000 KM	600 KM	Završeno u roku	
16	1.7	Plastične wc kabine	ISMAR	01.12.09.	15.05.10.	165	100%	4.095,00 KM	4.095 KM	4.095 KM	Stigle, postavljene na vrhu.	
17	1.8	Krma kula izložba arheo. Iskopina - sanacija krova	MUZEJ	15.01.10.	01.05.10.	106	90%	28.000,00 KM	30.000 KM	0 KM	Nije realizovano tokom godine, zbog nedostatka sredstava. Obezbijeđena sredstva putem 2 projekta, nisu transferirana sva sredstva. Pripremljen projekat.	
18	1.9	Sanacija zidina		16.01.10.	30.08.10.	226	100%	102.500,00 KM	100.000 KM	99.777 KM	Realizirano, plaćeno i podnesen izvještaj. Izvještaj usvojen.	
19	1.10	Pozornica	ISMAR					5.780 KM	5.780 KM	Prepravke i proširenje pozornice		
20	2	ORGANIZ. I UPRAVLJANJE	01.01.10.	01.01.11.	365	97%	13.298 KM	34.659 KM	13.948 KM			
21	2.1	Prodaja karata	STARI GRAD	01.04.10.	15.10.10.	197	100%	8.598,00 KM	12.748 KM	12.748 KM	U rashodu prikazane plate i drugi troškovi	
22	2.2	Pravilnica hilgawina		15.02.10.	01.04.10.	45		1.500,00 KM	1.500 KM	0 KM	Nije izrađena, zbog problema sa suvenirnicom. Za ovu godinu možemo proći bez nje, jer je došlo do promjene koncepta sa suvenirnicom. Samo prefarbana	

POJEDINAČNE AKTIVNOSTI

1	INFRASTRUKTURA	03.01.10.	10.08.10.	219	78%
1.1	WC do ljetne bašte	03.01.10.	01.05.10.	118	25%
1.2	Staze, rukohvati	03.01.10.	01.05.10.	118	90%
1.3	Zaštitna ograda	22.01.10.	10.08.10.	200	35%
1.4	Inventar na platou	01.12.09.	15.05.10.	165	90%
1.5	Krnja kula_donji sprat	01.12.09.	15.05.10.	165	100%
1.6	Rasvjeta ispod velike tabije	03.01.10.	01.05.10.	118	100%
1.7	Plastične wc kabine	01.12.09.	15.05.10.	165	100%
1.8	Krnja kula izložba arheo. iskopina - sanacija krova	15.01.10.	01.05.10.	106	90%
1.9	Sanacija zidina	16.01.10.	30.08.10.	226	100%
1.10	Pozornica				
2	ORGANIZ. I UPRAVLJANJE	01.01.10.	01.01.11.	365	97%
2.1	Prodaja karata	01.04.10.	15.10.10.	197	100%
2.2	Pravljenje biletarnice	15.02.10.	01.04.10.	45	
2.3	Čišćenje, košenje, uređenje	18.03.10.	01.04.10.	14	100%
2.4	Čuvanje, zaključavanje, obilasci	01.01.10.	01.01.11.	365	100%
2.5	Uređenje prilaza	08.03.10.	01.04.10.	24	100%
3	TURISTIČKI SADRŽAJ	03.01.10.	15.10.10.	285	71%
3.1	Vodiči unutar tvrđave	16.04.10.	15.10.10.	182	100%
3.2	Topovi	03.01.10.	01.05.10.	118	20%
3.3	Dječije igralište	01.04.10.	15.05.10.	44	100%
3.4	Arheološka zbirka	05.07.10.	03.10.10.	90	100%
3.5	Binokular	01.12.09.	15.05.10.	165	100%
3.6	T signalizacija (Gradina i Info tabla kod skretanja na čaršiji)	03.01.10.	01.05.10.	118	15%
3.7	Plan Grada na parkingu, brojevi telefona	15.02.10.	01.04.10.	45	0%
3.8	Suvenirnica	01.04.10.	16.04.10.	15	100%
3.9	Revitalizirana Kula	01.04.10.	16.04.10.	15	100%
3.10	Ljetna bašta	01.04.10.	16.04.10.	15	100%
3.11	WC	01.04.10.	12.09.10.	15	100%
4	PROMOCIJA I KULT. SADRŽAJ	25.04.10.	03.10.10.	161	27%
3.1	Promotivni materijal samo Gradina i Tešanj	01.02.10.	15.03.10.	42	0%
3.2	Pozivanje prema školama, tur. operaterima	01.02.10.	15.05.10.	103	100%
3.3	Razglednica	01.04.10.	03.10.10.	185	0%
3.4	Uvezivanje najavljenih dolazaka	15.03.10.	01.10.10.	200	20%
3.5	Kulturni sadržaji (MDGF)	01.04.10.	30.09.10.	182	100%
3.6	Kulturni sadržaji -drugo	02.04.10.	01.10.10.	182	100%


ULAGANJA

Br	PODRUČJE	2009	2010
1.	Infrastruktura	217.064 KM	158.942 KM
2.	Organizacija i upravljanje	9.876 KM	13.948 KM
3.	Turistički sadržaj	6.574 KM	10.955 KM
4.	Promocija i kulturni sadržaji	5.064 KM	10.270 KM
	Ukupno	238.579 KM	194.115 KM

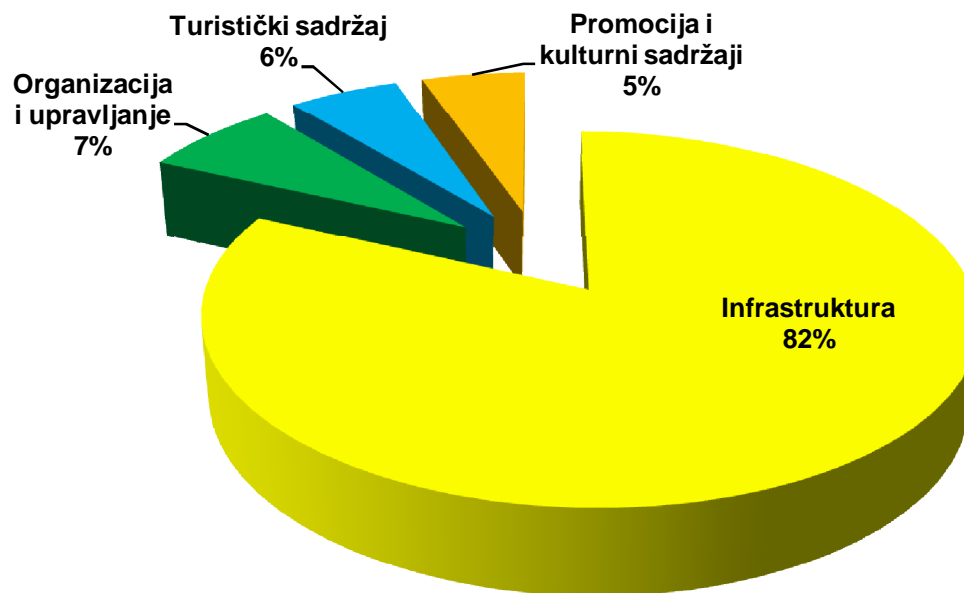

POSJETE

Godina	2007.	2008.	2009.	2010.
Broj posjetilaca	6946	8277	7018	6459 !!!
Prihodi			9545	7956
Rashodi			10.910 KM	12.748 KM

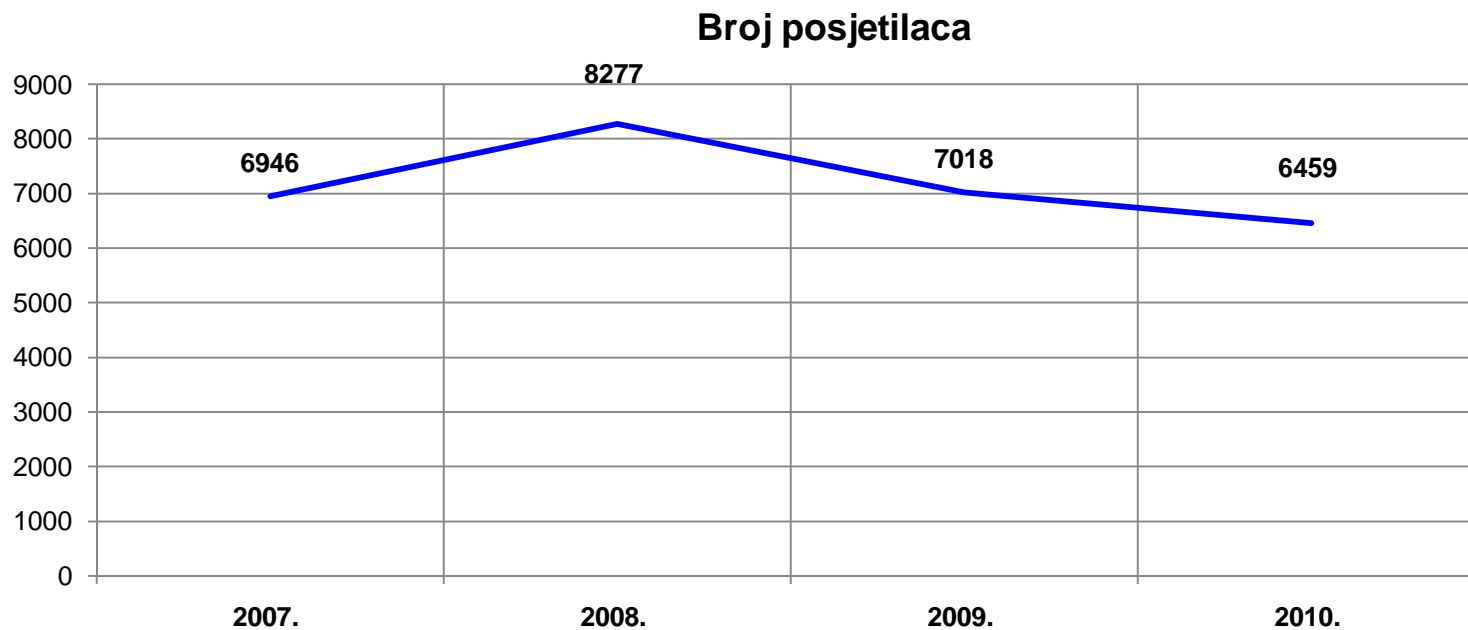

ANALIZA

DOBRO

LOŠE

DOBRO

- Zadržana dinamika ulaganja i visok nivo sredstava,
- Obogaćena ponuda,
- Jačanje turističkih i kulturnih sadržaja,
- Urednost prostora,

TREBA POBOLJŠATI

- Nisu realizirane neke od planiranih aktivnosti (wc, Kapetanova kula, putokazi izvan Gradine),
- Mnogo učesnika, teškoća upravljanja i dogovaranja - različita viđenja i ciljevi, "šta je čiji posao"
- Promotivni materijali,
- Smanjenje broja gostiju! – domaći gosti?
- Evidencija i praćenje gostiju, prodaja karata

2. PLANVI ZA 2011.

INFRASTRUKTURA

- Popravka zidova urušene tabije,
- Krov Kapetanove kule i preseljenje Muzejske postavke,
- Zaštitna ograda,
- Uređenje dva kazamata na vrhu, ostava za opremu i suvenirnica,
- Glavni projekat za veliku tabiju (šank, nadstrešnice) i wc – po mogućnosti radovi,

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

- Javni poziv za suvenirnicu,
- Potreba uvezivanja turističke ponude, sa F. džamijom, E. konakom, mezarom MĆĆ,
- Zadržati nivo čistoće i urednosti,
- Gender
- Bolja saradnja Udruženja i TZ ZDK
- Radno vrijeme *kompleksa, zaštita*

2. PLANovi ZA 2011.

TURISTIČKI SADRŽAJ

- Postavljanje binokulara,
- Nabavka barem dva topa, katapulta,
- Popravak i premještanje igrališta,
- Radno vrijeme ljetne bašte,
- Sadržaj u Dizdarevoj kuli,

PROMOCIJA I KULT. SADRŽAJ

- Nova web stranica,
- Promotivni materijal !!!

A SADA VI...

DOBRO

LOŠE

DOBRO

- Argument 1
- Argument 2
- Argument 3
- Argument 4

TREBA POBOLJŠATI

- Argument 1
- Argument 2
- Argument 3
- Argument 4

TEŠANJ 2010.



TEŠANJ 2011

